


OBRAS DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD EN GRADERÍOS Y ACCESOS PERIMETRALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS																							
N°	ACTIVIDAD	CALENDARIO DE OBRA Y PROGRAMA ECONOMICO																					
		OBRA PEM	15.216,32	15.216,32	77.856,18	77.856,18	82.261,36	82.261,36	82.261,36	87.645,73	87.645,73	87.645,73	87.645,73	87.645,72	83.240,54	83.240,54	83.240,54	83.240,54	80.406,25	80.406,25	80.406,25	75.021,89	1.520.360,52
			semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	semana	
		Importe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			mes				mes				mes				mes				mes				
		Importe	1				2				3				4				5				

Programa de inversión económica COMO PRESUPUESTO DE LICITACION																							
1.-	ACTUACIONES PREVIAS Y VARIOS	45.348,69	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	2.834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,69	
2.-	ACTUACIONES EN GRADERIOS	232.801,93	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	11.640,10	232.801,93	
3.-	ACTUACIONES EN ACCESOS	1.122.985,54	0,00	0,00	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	62.388,09	1.122.985,54	
4.-	ACTUACIONES SALA PRENSA Y BIB. J.M. CO	35.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,18	4.405,18	4.405,18	4.405,18	4.405,18	4.405,18	4.405,18	4.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.241,44	
5.-	ACTUACIONES PATIOS	64.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	5.384,37	0,00	64.612,39	
6.-	GERSTIÓN DE RESIDUOS	4.531,88	0,00	0,00	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77	4.531,88	
7.-	SEGURIDAD Y SALUD	14.838,65	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	741,93	14.838,65	
8.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EJECUCION MATERIAL		1.520.360,52	15.216,32	15.216,32	77.856,18	77.856,18	82.261,36	82.261,36	82.261,36	87.645,73	87.645,73	87.645,73	87.645,73	87.645,72	83.240,54	83.240,54	83.240,54	83.240,54	80.406,25	80.406,25	80.406,25	75.021,89	1.520.360,52

Semanas



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20


Semanal	15.216,32	15.216,32	77.856,18	77.856,18	82.261,36	82.261,36	82.261,36	87.645,73	87.645,73	87.645,73	87.645,73	87.645,72	83.240,54	83.240,54	83.240,54	83.240,54	80.406,25	80.406,25	80.406,25	75.021,89	
13%	1.978,12	1.978,12	10.121,30	10.121,30	10.693,98	10.693,98	10.693,98	11.393,94	11.393,94	11.393,94	11.393,94	11.393,94	10.821,27	10.821,27	10.821,27	10.821,27	10.452,81	10.452,81	10.452,81	9.752,85	
6%	912,98	912,98	4.671,37	4.671,37	4.935,68	4.935,68	4.935,68	5.258,74	5.258,74	5.258,74	5.258,74	5.258,74	4.994,43	4.994,43	4.994,43	4.994,43	4.824,38	4.824,38	4.824,38	4.501,31	
TOTAL	18.107,42	18.107,42	92.648,85	92.648,85	97.891,02	97.891,02	97.891,02	104.298,41	104.298,41	104.298,41	104.298,41	104.298,40	99.056,24	99.056,24	99.056,24	99.056,24	95.683,44	95.683,44	95.683,44	89.276,05	
21%	3.802,56	3.802,56	19.456,26	19.456,26	20.557,11	20.557,11	20.557,11	21.902,67	21.902,67	21.902,67	21.902,67	21.902,66	20.801,81	20.801,81	20.801,81	20.801,81	20.093,52	20.093,52	20.093,52	18.747,97	
TOTAL	21.909,98	21.909,98	112.105,11	112.105,11	118.448,13	118.448,13	118.448,13	126.201,08	126.201,08	126.201,08	126.201,08	126.201,06	119.858,05	119.858,05	119.858,05	119.858,05	115.776,96	115.776,96	115.776,96	108.024,02	

Mensual				186.145,00				334.429,81				350.582,91				332.962,16				316.240,64	
13%				24.198,85				43.475,88				45.575,78				43.285,08				41.111,28	
6%				11.168,70				20.065,79				21.034,97				19.977,73				18.974,44	
TOTAL				221.512,55				397.971,48				417.193,66				396.224,97				376.326,36	
21%				46.517,64				83.574,01				87.610,67				83.207,24				79.028,54	
TOTAL				268.030,19				481.545,49				504.804,33				479.432,21				455.354,90	

A ORIGEN	15.216,32	30.432,64	108.288,82	186.145,00	268.406,36	350.667,72	432.929,08	520.574,81	608.220,54	695.866,27	783.512,00	871.157,72	954.398,26	1.037.638,80	1.120.879,34	1.204.119,88	1.284.526,13	1.364.932,38	1.445.338,63	1.520.360,52	
13%	1.978,12	3.956,24	14.077,55	24.198,85	34.892,83	45.586,80	56.280,78	67.674,73	79.068,67	90.462,62	101.856,56	113.250,50	124.071,77	134.893,04	145.714,31	156.535,58	166.988,40	177.441,21	187.894,02	197.646,87	
6%	912,98	1.825,96	6.497,33	11.168,70	16.104,38	21.040,06	25.975,74	31.234,49	36.493,23	41.751,98	47.010,72	52.269,46	57.263,90	62.258,33	67.252,76	72.247,19	77.071,57	81.895,94	86.720,32	91.221,63	
TOTAL	18.107,42	36.214,84	128.863,70	221.512,55	319.403,57	417.294,58	515.185,60	619.484,03	723.782,44	828.080,87	932.379,28	1.036.677,68	1.135.733,93	1.234.790,17	1.333.846,41	1.432.902,65	1.528.586,10	1.624.269,53	1.719.952,97	1.809.229,02	
21%	3.802,56	7.605,12	27.061,38	46.517,64	67.074,75	87.631,86	108.188,98	130.091,65	151.994,31	173.896,98	195.799,65	217.702,31	238.504,13	259.305,94	280.107,75	300.909,56	321.003,08	341.096,60	361.190,12	379.938,09	
TOTAL	21.909,98	43.819,96	155.925,08	268.030,19	386.478,32	504.926,44	623.374,58	749.575,68	875.776,75	1.001.977,85	1.128.178,93	1.254.379,99	1.374.238,06	1.494.096,11	1.613.954,16	1.733.812,21	1.849.589,18	1.965.366,13	2.081.143,09	2.189.167,11	

ANUALIDADES	2.189.167,11
-------------	--------------

DIAGRAMA DE GANT

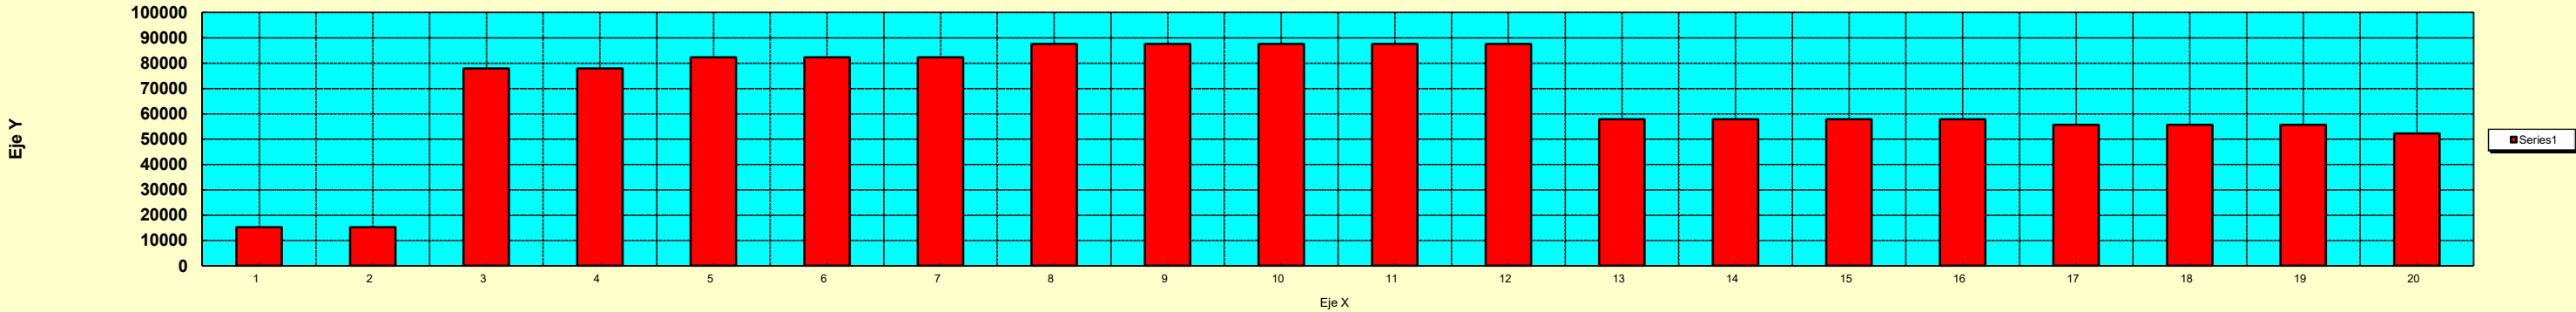

Madrid Septiembre de 2022

*Justo Benito Batanero*

JUSTO BENITO BATANERO  
Arquitecto Colegiado COAM 13,303
