




EDIFICIO "A"

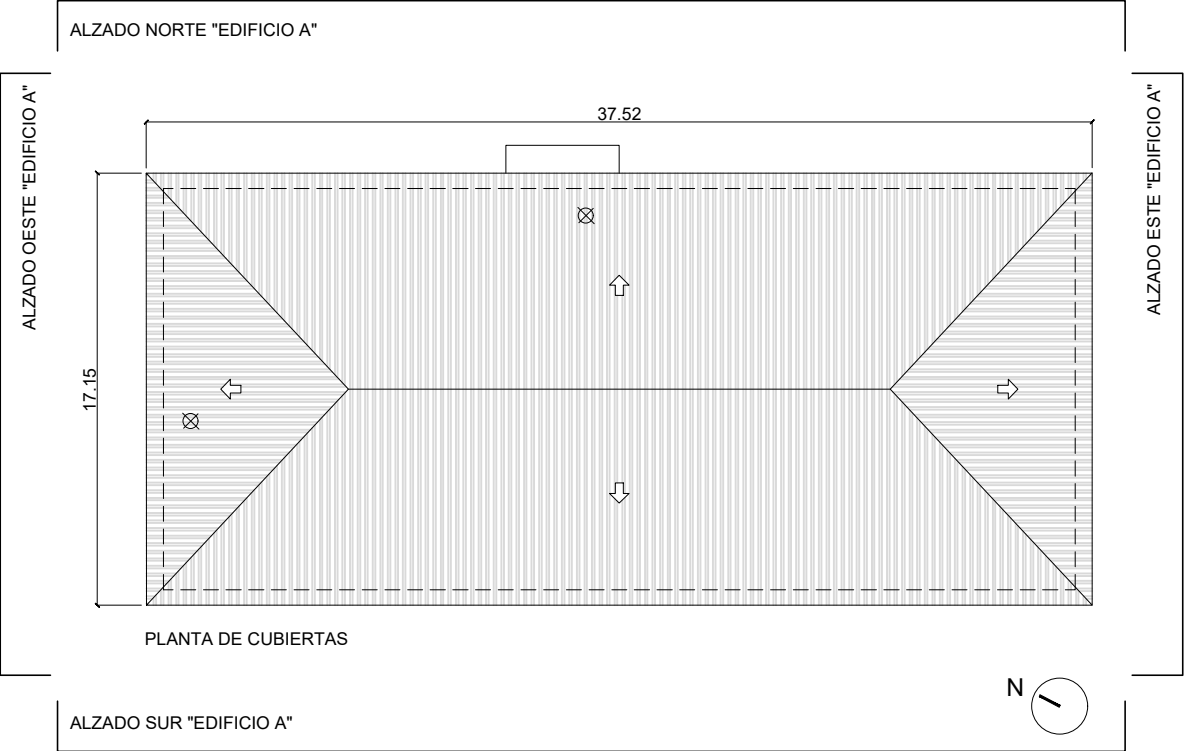


MEDIDAS DE SEGURIDAD DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON ACABADO DE PANEL SANDWICH RECUBIERTO DE TEJA

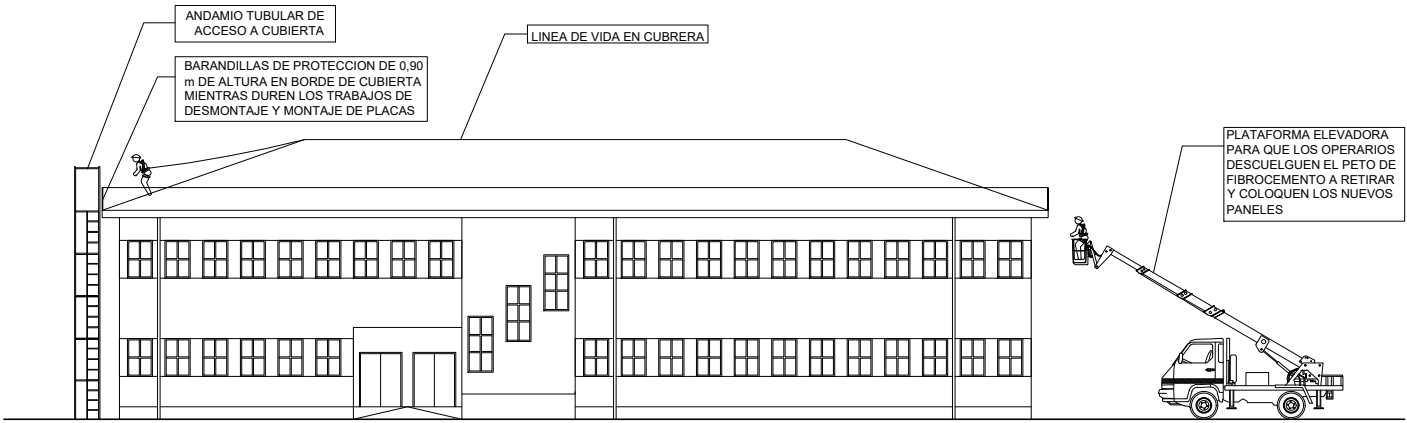


ALZADO OESTE EDIFICIO "A"

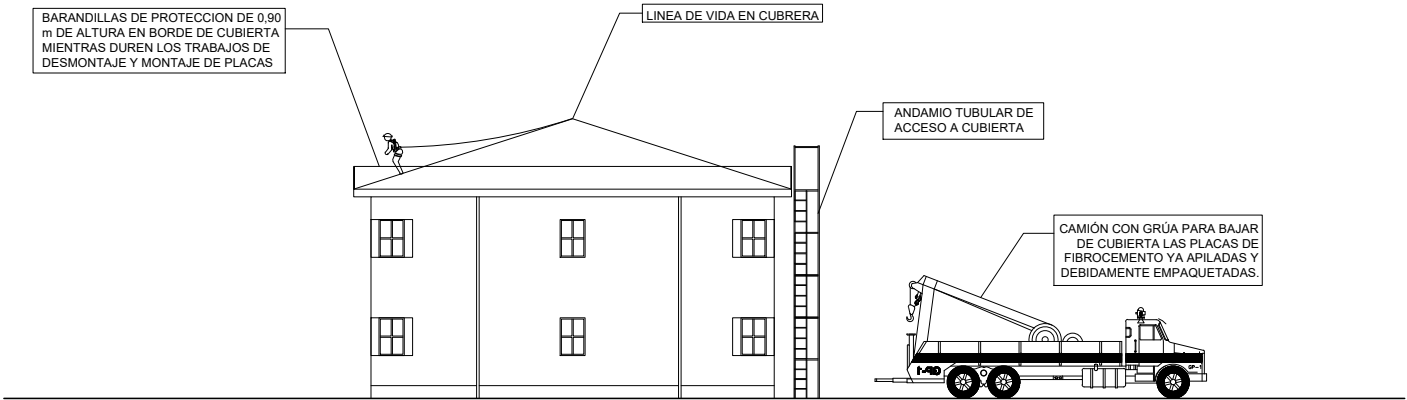

ALZADO NORTE EDIFICIO "A"

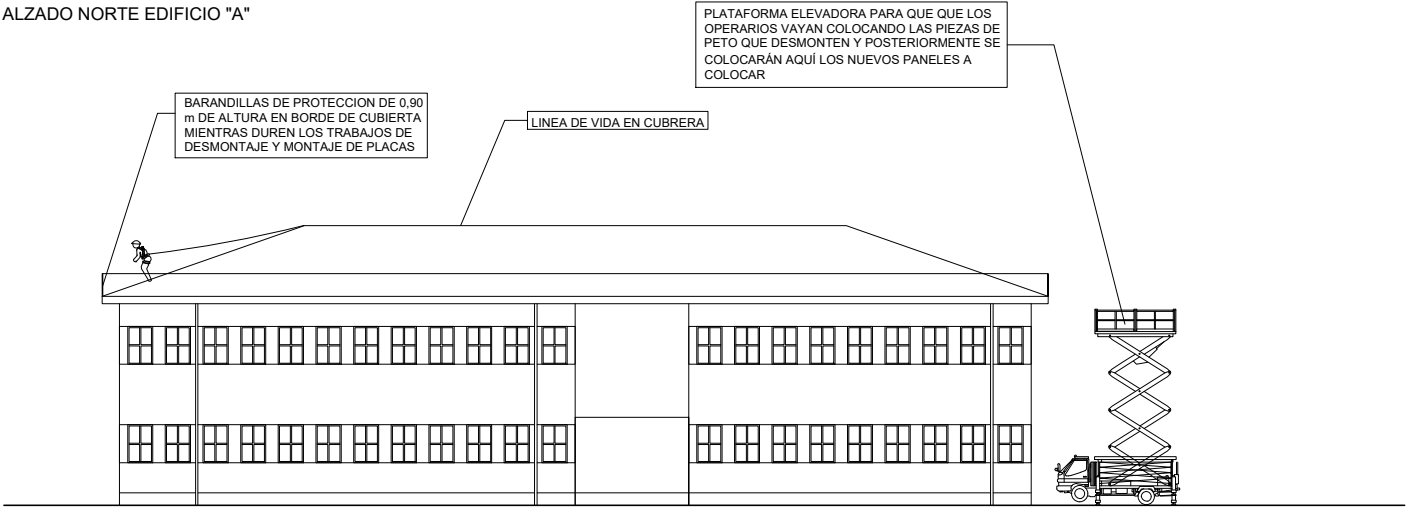


ALZADO ESTE EDIFICIO "A"

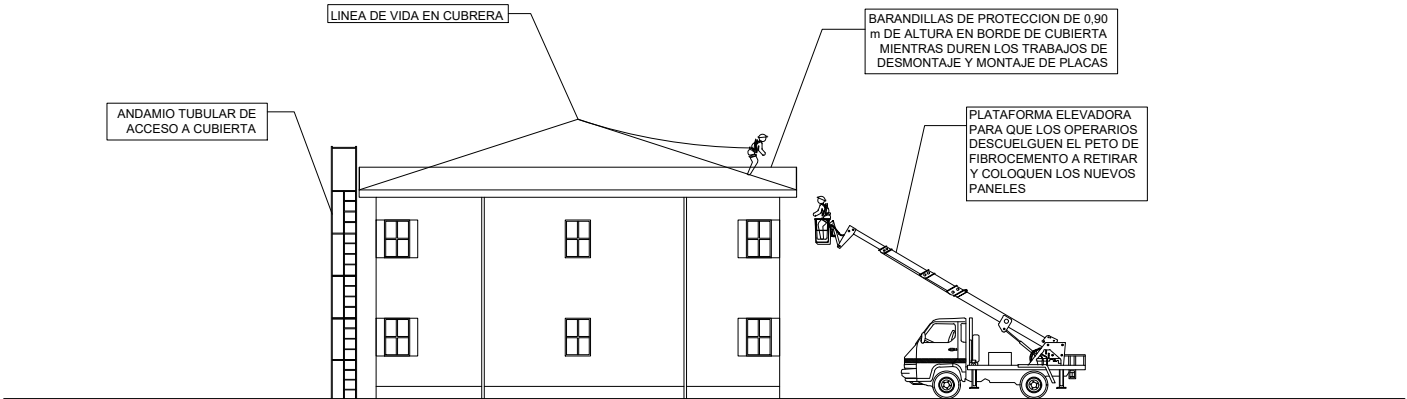


ALZADO SUR EDIFICIO "A"


EDIFICIO "A"

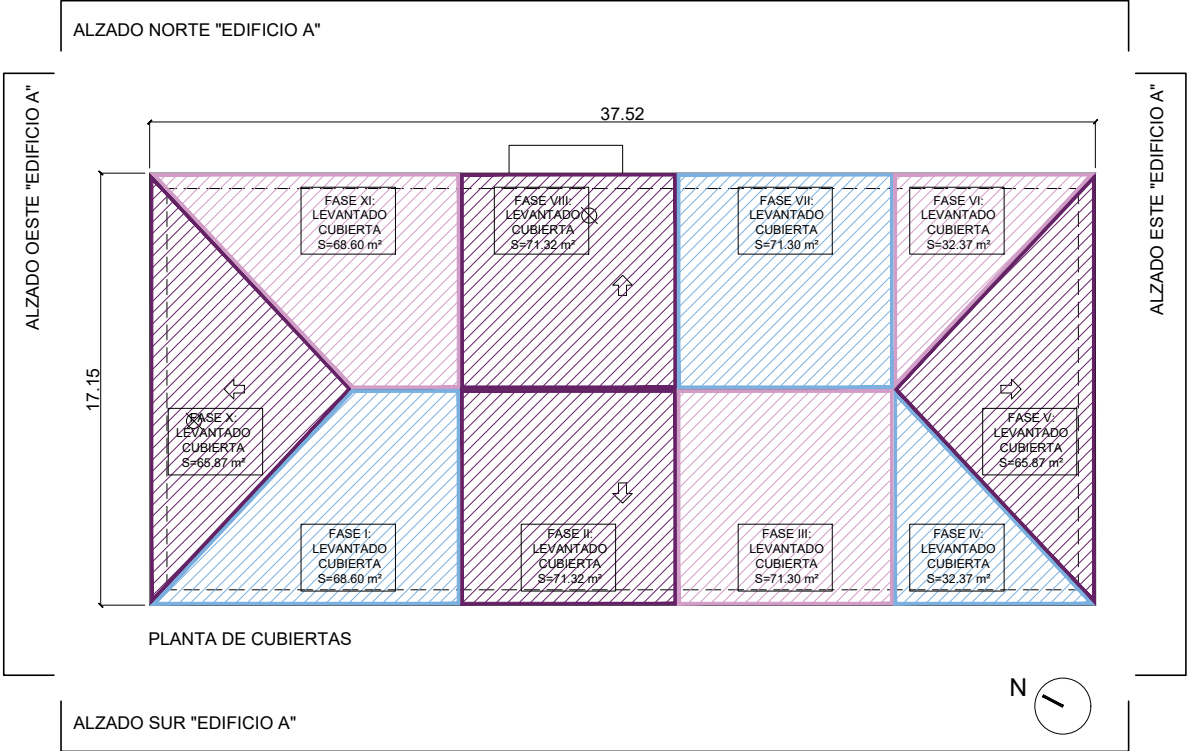


FASES DE EJECUCIÓN DE OBRA

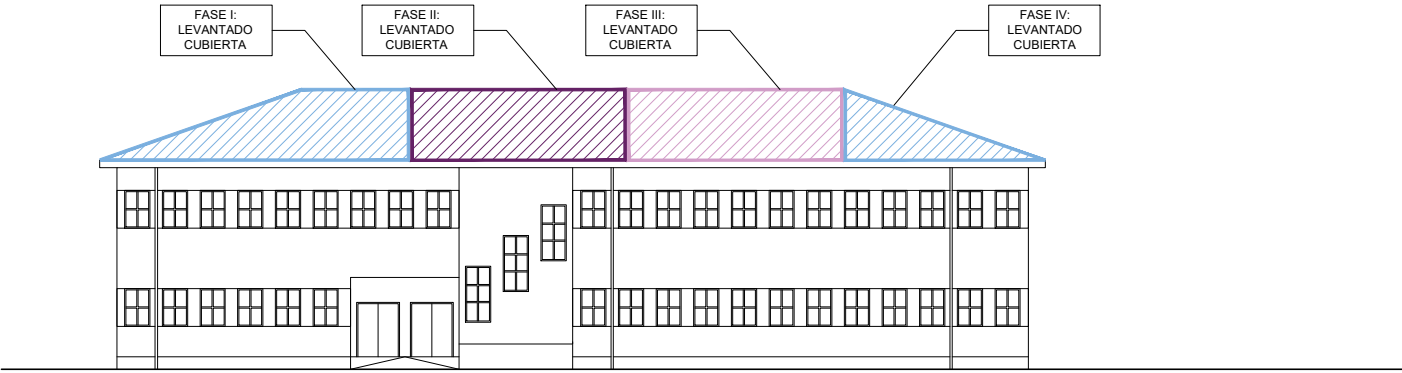


ALZADO OESTE EDIFICIO "A"

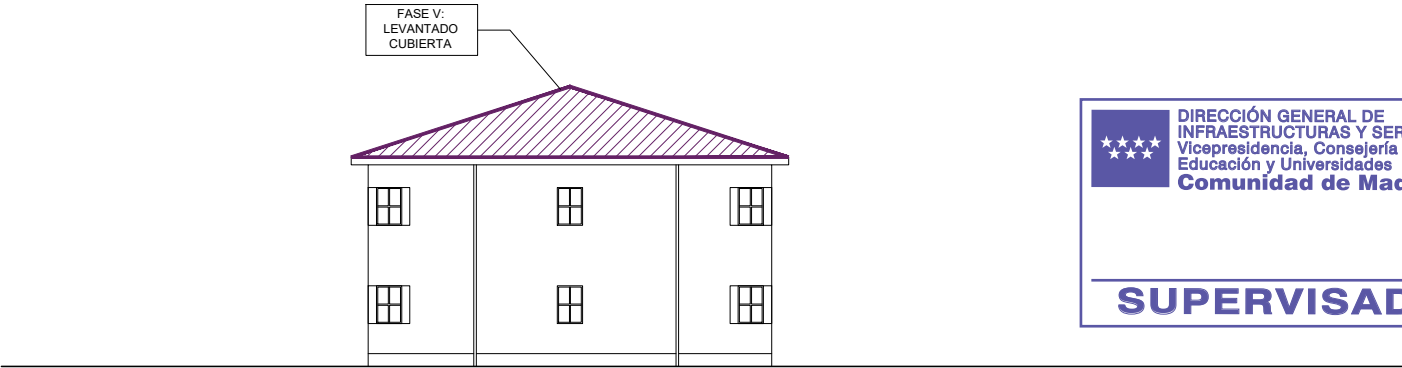

ALZADO NORTE EDIFICIO "A"

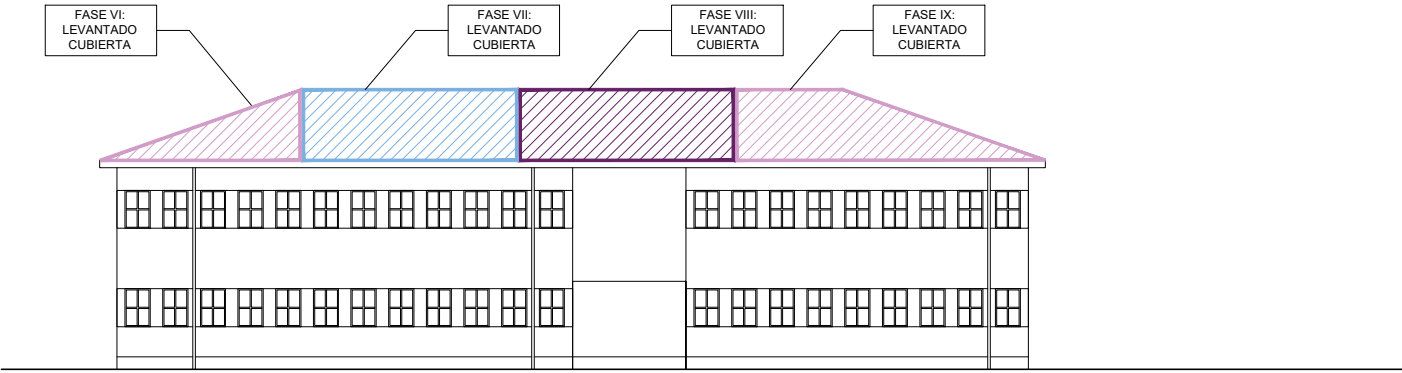


ALZADO ESTE EDIFICIO "A"

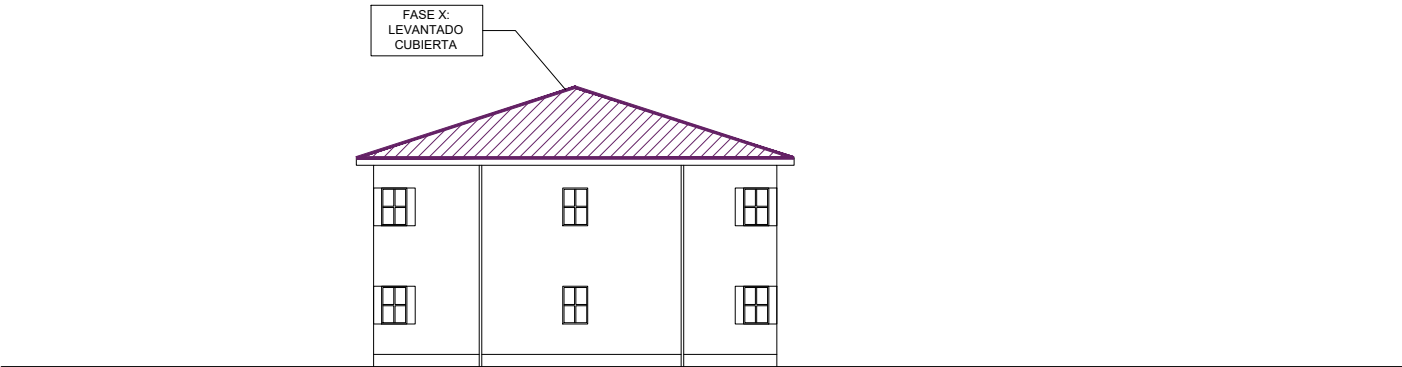

ALZADO SUR EDIFICIO "A"

CEIP VALDEMERIA_INTERVENCIÓN 1: SUSTITUCIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO

LA INTERVENCIÓN 1, A REALIZAR EN EL CEIP VALDEMERIA DE VEULLA DE SAN ANTONIO, CONSISTE EN LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO CON LA QUE CUENTA EL "EDIFICIO A", EDIFICIO PRINCIPAL DEL CENTRO.

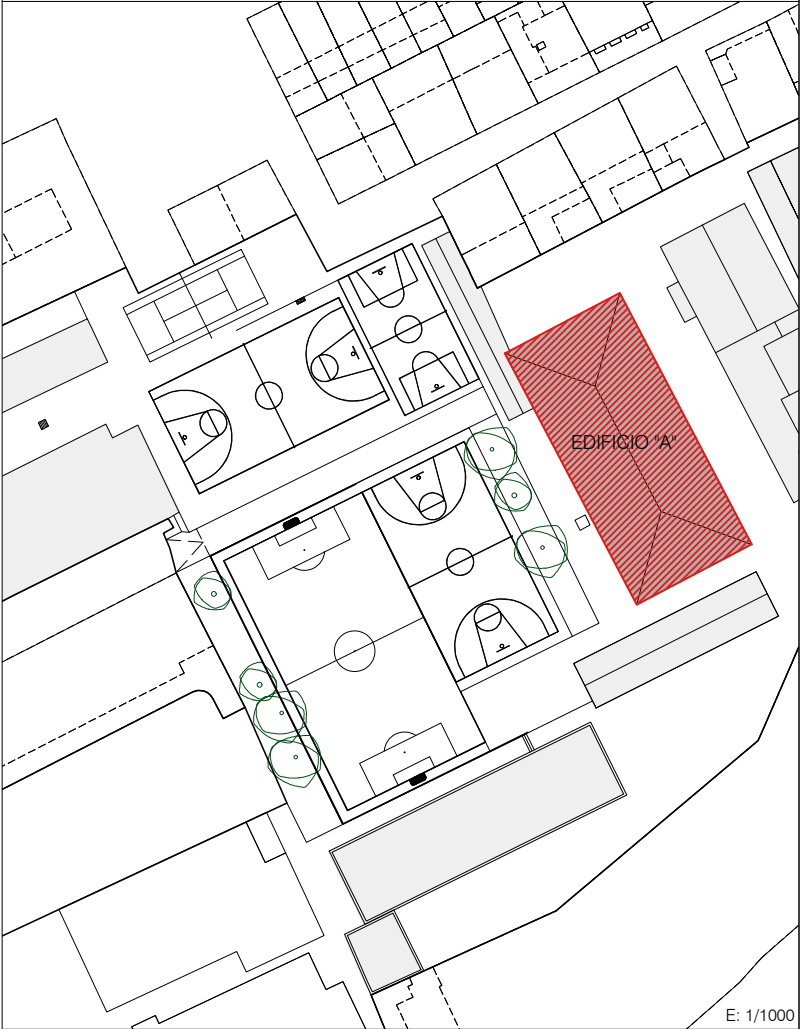

NOTAS:

- SE COLOCARÁN LONAS A MODO DE PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LOS INTERIORES DURANTE EL TIEMPO QUE LA CUBIERTA PERMANEZCA RETIRADA, CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS OCASIONADOS POR POSIBLES LLUVIAS U OTROS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS.

- SE PREVE UNA SUPERFICIE DE CUBRICIÓN MÁXIMA DE LONA, PARA PROTECCIÓN PROVISIONAL, DE 70 m2 APROXIMADAMENTE. POR LO QUE EL DESMONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO Y POSTERIOR MONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE PANEL SANDWICH SE REALIZARÁ POR FASES DE MÁXIMO 70 m2 DE SUPERFICIE DE CUBIERTA.

- CADA FASE INCLUIRÁ EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA, Y LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA CUBIERTA DE PANEL SANDWICH, PREVIAMENTE AL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO DE LA FASE SIGUIENTE.

- SE MUESTRAN LAS FASES EN ORDEN DE EJECUCIÓN.

- PREVIAMENTE AL INICIO DEL TRABAJO POR FASES SE PORCEDERÁ AL LEVANTADO DE TODA LA CUBRICIÓN DE TEJA.

- UNA VEZ QUE SE TENGA INSTALADA TODA LA CUBIERTA DE PANEL SANDWICH SE PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA CUBRICIÓN DE TEJA.

Dirección General de Infraestructuras y Servicios Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y ADECUACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL CEIP VALDEMERIA

SITUACION CALLE SAN ANTONIO Nº6, 28891, VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)

PLANO SEGURIDAD Y SALUD. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y FASES DE OBRA.

PROPIEDAD D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades c/ Santa Hortensia, 30. 28002 Madrid

AUTOR DEL PROYECTO: Martín Collantes Saucá Manuel Lamet Gil

ESCALA DINA2 1/300

FECHA mayo 2023

4 REAL_OFICINA TÉCNICA ARQUITECTURA E INGENIERÍA
