



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL  
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA  
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL  
PROYECTO DE “RENOVACIÓN DE LA RED DE  
SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE  
FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. FASE I (PLAN  
SANEA 2500)”.**

**CONTRATO N.º 2025/06**



## ÍNDICE

1.- OBJETO .....	3
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR .....	3
3.- DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL DESARROLLO DEL PROYECTO .....	3
4.- CALENDARIO DE LOS TRABAJOS .....	3
5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .....	8
5.1.- FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO. ....	9
5.1.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO .....	9
5.1.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.....	9
5.1.2.1. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS.....	9
5.1.2.2. EQUIPO TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO.....	9
5.1.2.3. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CURSO .....	10
5.1.2.4. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	10
5.1.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO .....	10
6. PLANO Y FICHAS DE LAS ACTUACIONES .....	20

## 1.- OBJETO

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PTT) es el contrato de la prestación de servicios de **REDACCIÓN DE PROYECTO DE "RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. FASE I (PLAN SANEA 2500)"**.

## 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar consisten en el diseño de la solución y redacción del correspondiente proyecto constructivo de las obras contempladas en un conjunto de actuaciones incluidas en el Plan Director de saneamiento vigente del municipio de Fresnedillas de la Oliva, todas ellas de máxima prioridad.

A continuación, se describen las actuaciones referidas en el párrafo anterior para solucionar los problemas de funcionamiento en la red de saneamiento de Fresnedillas de la Oliva.

El Plan Director contempla una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Estas actuaciones son: **ALC\_FRO\_P1A\_01, ALC\_FRO\_P1A\_02, ALC\_FRO\_P1A\_03, ALC\_FRO\_P1A\_04, ALC\_FRO\_P1A\_05 y ALC\_FRO\_P1A\_06**. Por otro lado, se incluye la **ALC\_FRO\_P1B\_02** que tiene como objetivo el retranqueo por las calles Fraguas y de Las Fuentes de un colector que discurre por una parcela privada.

La anterior enumeración de actuaciones se corresponde con una identificación inicial de los trabajos a acometer en la presente Fase I. El alcance definido en las mismas no ha de tener carácter estricto ni limitativo en cuanto a la definición final de las actuaciones a ejecutar. Esta definición final será acorde con las necesidades que presente la red de saneamiento en los tramos definidos, una vez recabada toda la información actualizada de los mismos y estudiada la solución adecuada desde un punto de vista técnico y económico

**Se realizará un estudio de detalle de las actuaciones anteriores con la posibilidad de ser sustituidas, en su totalidad o en parte, por otras de similares características, así como ampliadas o reducidas por necesidades del conjunto de la actuación.**

## 3.- DISPOSICIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Para la redacción del proyecto, además de la normativa oficial que específicamente determine el Director de los trabajos, y lo especificado en el presente Pliego, se tendrán en cuenta las siguientes Disposiciones, Normas y Reglamentos:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente Procedimiento.
- Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 129 de 1 de junio de 2004).

- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 310 de 30 de diciembre de 2008).
- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público (BOCM de 29 de diciembre de 2010. Corrección de errores: BOCM de 25 de febrero y 15 de abril de 2011).
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.
- Normas para redes de abastecimiento. Canal de Isabel II.
- Normas para redes de saneamiento. Canal de Isabel II.
- Normas para redes de reutilización. Canal de Isabel II.
- Especificación técnica de acometidas de agua para consumo humano. Canal de Isabel II.
- Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Canal de Isabel II.
- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de compuerta. Canal de Isabel II.
- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de aireación. Canal de Isabel II, (1-7-1994).
- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de regulación y seguridad. Canal de Isabel II.
- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: válvulas de mariposa - 1ª revisión. Canal de Isabel II.
- Normas Técnicas para la instalación de tritubo de polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones. Canal de Isabel II.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (1974). O.M. de 28 de julio de 1974.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (1986). O.M. de 15 de septiembre de 1986.
- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX (2006).
- Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX (2007).
- Normas ASTM y AWWA sobre tuberías y conducciones de agua.
- Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado.
- Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa.
- Manual de ATHA sobre cálculo, diseño e instalación de tubos de hormigón armado.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/1975), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con las modificaciones posteriores.
- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.
- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE de 30 de septiembre de 2015)
- Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM de 21 de marzo de 1991. Corrección de errores: BOCM de 23 de abril de 1991).
- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Real Decreto 320/2024, de 26 de marzo, por el que se modifica la instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.
- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de la Edificación y posteriores modificaciones.
- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 18 de octubre de 2008).
- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
- Normas Tecnológicas de la Edificación.
- Ley 10/1996, de 29 de noviembre, por la que se modifica la composición del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, prevista en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio.
- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales.
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción contra Incendios.
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre de 2009.
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.
- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Real Decreto 614/2024 por el que se modifica el anterior.
- Orden 688/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se modifica la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, del Consejero de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. (BOE de 4 de septiembre de 2006).
- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23.
- Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. Está derogado excepto la disposición adicional 4, por el siguiente Real Decreto:
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
- Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de media del sistema eléctrico.
- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. (BOCM de 27 de octubre de 1997).
- Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna (BOCM de 25 de marzo de 1998).
- Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de transformación de tercera categoría.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE de 10 de noviembre de 1995), y los Reales Decretos que la complementan.
- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero sobre Reglamento de los Servicios de Prevención y Reales Decretos que le modifican.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001).
- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1971. Derogado, a excepción de los capítulos I a V y VII del Título II, por el siguiente Real Decreto:
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el acta derivada del IV Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
- Orden de 28 de diciembre de 1994 por la que, en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la vigencia de determinadas ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo.
- Prescripciones Generales de Seguridad en Trabajos Eléctricos Canal de Isabel II.
- Normas UNE.
- Normas UNE-EN.
- Normas UNE-EN-ISO.

#### 4.- CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

El plazo de duración del contrato será de **CINCO (5) MESES** a contar desde el Acta de inicio de los trabajos. A partir de este momento, tendrá lugar una reunión de inicio de proyecto en la que el adjudicatario presentará una planificación detallada de los trabajos que, una vez aprobado por el Director del Proyecto, servirá para realizar su seguimiento y control, que incluirá al menos:

- Actividades a desarrollar: toma de datos, documentos previos, etc.
- Reuniones
- Visitas a campo
- Plazos parciales y totales
- Principales hitos y camino crítico.

**En el primer mes de contrato, contado desde la fecha de firma del Acta de Inicio, el licitador deberá entregar la documentación necesaria, validada previamente por el propio Director de los trabajos, para la tramitación de los permisos oportunos ante los organismos afectados.**

#### 5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario tiene la obligación de inspeccionar y estudiar el emplazamiento de las obras y sus alrededores, accesos al emplazamiento, naturaleza y configuración del terreno, condiciones hidrológicas y climáticas, naturaleza de los trabajos a realizar, materiales y medios necesarios, y en general obtener toda la información que pueda incidir en la redacción de los documentos técnicos y de los proyectos y en la ejecución y en el coste de las obras, no pudiendo, salvo que explícitamente se establezca lo contrario, eludir su responsabilidad ni formular reclamación alguna.

## 5.1.- FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO.

### 5.1.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Todos los documentos se presentarán al Director de los trabajos según se vayan completando para su aprobación. Además, previamente a la composición del documento definitivo, el adjudicatario entregará una copia de un borrador final o maqueta del proyecto completo para comprobar que se ajusta a lo requerido.

El documento definitivo, se presentará en formato CD, conteniendo lo siguiente:

- Dos (2) CD del proyecto completo con **todos** los ficheros en formatos originales en editable
- Dos (2) CD del proyecto completo con una versión íntegra (de **todos** los documentos) en PDF también firmados
- Dos (2) CD con el presupuesto en EXCEL y PRESTO
- Dos (2) CD con los planos en AUTOCAD y planta proyectada en formato GIS

Los planos se entregarán con el sello de identificación proporcionado por Canal de Isabel II.

Los formatos originales serán; para los archivos de texto Word, para los cálculos Excel u otros programas de cálculo especializados; para los archivos gráficos AUTOCAD y para los presupuestos PRESTO.

Será preceptiva la entrega de las salidas de los programas utilizados, así como toda la documentación manejada durante el desarrollo de los trabajos.

### 5.1.2. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

#### 5.1.2.1. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

Canal de Isabel II designará como Director de los trabajos a un ingeniero del Área Técnica que en su momento dará a conocer al Adjudicatario.

#### 5.1.2.2. EQUIPO TÉCNICO DEL ADJUDICATARIO

El licitador especificará en su oferta el equipo técnico indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El Adjudicatario deberá contar con la plantilla de titulados y profesionales especializados en los distintos aspectos técnicos de los trabajos a realizar según se dispone en los requisitos establecidos en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los Técnicos exigidos, sin titulación expresa, deberán ser especialistas en el área requerida, y poseer la titulación adecuada.

**El Jefe de Proyecto será el responsable del proyecto en ejecución y como tal el contacto directo con el Director del Proyecto para cualquier comunicación.** El Jefe de Proyecto será también el autor del proyecto.

Es obligación esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda la duración del contrato. En caso de necesidad de variación de alguno de los técnicos presentados en la oferta inicial, se deberá comunicar a la empresa, presentando la misma

documentación que fue requerida en la oferta y que deberá ser aprobada por Canal de Isabel II.

En cualquier momento del contrato podrá ser requerida la presencia de cualquiera del personal enumerado para la justificación, explicación o modificación de alguna de las partes del proyecto.

El licitador presentará relación detallada de los medios técnicos que se compromete a poner a disposición del equipo de trabajo para la realización de los trabajos, tales como equipos informáticos para edición de textos y elaboración de planos y presupuestos. Todos los medios necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas informáticos, vehículos, edición de documentos...) serán por cuenta del Adjudicatario.

#### **5.1.2.3. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CURSO**

Es responsabilidad del Director de los trabajos la inspección de los mismos. El Adjudicatario facilitará al Director o sus representantes, con la frecuencia que estimen necesaria, el examen de los documentos recopilados y elaborados hasta ese momento.

En ningún caso las normas contenidas en este Pliego servirán para justificar la omisión de estudios o cálculos que deban integrarse en la redacción de los trabajos.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecerá el criterio del Director de los trabajos.

#### **5.1.2.4. APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS**

El Director de los trabajos determinará la aceptación provisional de las entregas parciales del mismo que se vayan produciendo. Esto no supone la aceptación definitiva, que se hará a la vista de todo el trabajo realizado y conforme.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serán propiedad de Canal de Isabel II, en los términos establecidos en la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El Adjudicatario garantizará, bajo su responsabilidad y de conformidad con la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la confidencialidad de los trabajos contratados y de la documentación suministrada por la Dirección impidiendo su reproducción, divulgación y traslado fuera de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la propiedad intelectual de los mismos corresponde a Canal de Isabel II.

El Adjudicatario deberá facilitar al Director todos los datos, cálculos, cartografía y material bibliográfico empleado en la elaboración de los Proyectos, salvo aquellos cuyo carácter reservado haya hecho constar en la Oferta y recogido en el documento de formalización del Contrato.

#### **5.1.3 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO**

El Adjudicatario tendrá obligación de presentar al Director del Proyecto las diferentes soluciones al proyecto, para entre ambas partes valorar cuál es la más adecuada en cada caso.

La elaboración de los siguientes documentos que integrarán el Proyecto a redactar partirá de la información facilitada por Canal de Isabel II al Adjudicatario y servirá como base para la redacción del proyecto.

Los trabajos a realizar para cada documento son los siguientes:

- **DOCUMENTO N.º 1. MEMORIA Y ANEJOS**

Incluirá, **entre otros**, un apartado por cada uno de los Anejos. En cada uno de estos apartados se expondrá la conclusión del correspondiente anejo, o aquellos aspectos relevantes del mismo, haciendo referencia al nº de anejo en que se desarrolla. Cuando el anejo incluya un determinado presupuesto se indicará en el apartado correspondiente el importe del mismo.

**El índice de la Memoria será acordado con el Director de los trabajos, un índice aproximado puede ser el siguiente** (puede no ser completo o por el contrario no ser necesarios todos los puntos, dependiendo del alcance del proyecto):

1. ANTECEDENTES
2. OBJETO DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
7. TRAZADO Y REPLANTEO
8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS.
9. CÁLCULOS ELECTRICOS
10. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
11. CÁLCULOS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES.
12. SEGURIDAD Y SALUD
13. TRAMITACIÓN AMBIENTAL
14. TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA
15. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
16. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
17. CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS
18. CONTROL DE CALIDAD
19. GESTIÓN DE RESIDUOS
20. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCIÓN DE OBRA
21. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS
22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
23. REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
24. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
25. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

El contenido de la Memoria se detallará en sus correspondientes Anejos, por lo que se incluirá en ella un apartado por cada uno de los Anejos. En dichos apartados, se hará referencia al anejo mediante un número, exponiendo los aspectos más relevantes o la conclusión a la que se haya llegado.

Los ANEJOS serán, a modo orientativo, los siguientes:

ANEJO N.º 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

ANEJO N.º 2 PLANEAMIENTO Y/O CONVENIO Y ADENDA

ANEJO N.º 3 CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO

ANEJO N.º 4 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

ANEJO N.º 5 REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO N.º 6 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

ANEJO N.º 7 SERVICIOS AFECTADOS

ANEJO N.º 8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS.

ANEJO N.º 9 CÁLCULOS ELÉCTRICOS

ANEJO N.º 10 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

ANEJO N.º 11 CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y MECÁNICOS.

ANEJO N.º 12 SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N.º 13 TRAMITACIÓN AMBIENTAL

ANEJO N.º 14 TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA

ANEJO N.º 15 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ANEJO N.º 16 PLAN DE OBRA

ANEJO N.º 17 CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS

ANEJO N.º 18 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS

ANEJO N.º 19. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

ANEJO N.º 20. GESTIÓN DE RESIDUOS

ANEJO N.º 21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

### **ANEJO N.º 1. Características principales del proyecto**

Contiene, **de forma esquemática**, la información necesaria para definir el alcance del proyecto. Ha de incluir como mínimo:

- Objeto del proyecto, ubicación, etc.
- Características del proyecto: diámetros de tuberías, longitudes, materiales, etc.
- Plazo de ejecución

- Clasificación del contratista
- Plano de planta general de la obra, donde se refleje la totalidad de las infraestructuras a proyectar.
- Resumen de Presupuestos
- Cualquier otro aspecto relevante

#### **ANEJO N.º 2. Planeamiento y/o convenio y adenda**

- Se recopilarán los planeamientos territoriales y urbanísticos vigentes de los municipios afectados. También se considerarán los Convenios firmados por Canal de Isabel II, S. A con los diferentes municipios o entidades.
- Se tendrán en cuenta también las normas urbanísticas municipales afectadas para tener en cuenta las distancias a linderos, alturas permitidas, edificabilidades, porcentajes de ocupación, etc.

#### **ANEJO N.º 3. Cartografía, topografía y replanteo**

- El adjudicatario deberá realizar un levantamiento topográfico detallado para la realización de los trabajos.
- Para la ejecución de elementos lineales, se incluirán las coordenadas UTM, a partir de los cuales se materializa el proyecto, de alineaciones y puntos singulares del trazado en planta y alzado.
- Se incluirá la información necesaria para el replanteo de puntos, cotas, alineaciones rectas y curvas, referidos a los planos de excavación, obra civil e instalaciones.
- Se enumerarán todos los condicionantes que se hayan tenido en cuenta para la implantación, y se definirán todos los puntos singulares y puntos de replanteo significativos.

#### **ANEJO N.º 4. Estudio geológico y geotécnico**

- El adjudicatario realizará un Estudio de Geología y Geotecnia de la zona afectada, para su análisis y aplicación al proyecto. **Previamente a la realización de estos trabajos, se deberá presentar una propuesta al Director de los Trabajos que podrá ser modificada según los ensayos in situ o de laboratorio que estime necesarios.**
- Estará incluido en el importe del contrato la realización de los ensayos in situ o en laboratorio para la determinación de los parámetros necesarios, así como el informe firmado por técnico competente.

### **ANEJO N.º 5. Reportaje fotográfico**

- El objeto de este anejo será recopilar información fotográfica de toda la zona de actuación donde quede perfectamente reflejado el estado actual de las zonas afectadas, así como los elementos más relevantes sobre los que se pretende actuar.

### **ANEJO N.º 6. Disponibilidad de terrenos**

### **ANEJO N.º 7. Servicios afectados**

- Se deberá contactar con todos los servicios (gas, electricidad, telefonía...) y organismos afectados por el Proyecto. Con la información obtenida se realizará una descripción de cada uno de los servicios afectados (carreteras, ferrocarril, vías pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, electricidad, comunicaciones, gas, oleoductos, etc.).
- En la conclusión de este anejo se incluirá un presupuesto que incluya los gastos derivados de las afecciones.
- Se estudiará el planeamiento territorial y urbanístico municipal afectado, por su posible interferencia en el proyecto y repercusión económica en el mismo.

### **ANEJO N.º 8. Cálculos hidráulicos**

Se determinarán los caudales de diseño y se incluirá el dimensionamiento y comprobación hidráulica de los colectores e impulsiones, en lo relativo a diámetros, pendientes, materiales, volúmenes, equipos e instalaciones necesarias para cumplir con los objetivos establecidos.

### **ANEJO N.º 9. Cálculos eléctricos**

Se definirán las instalaciones eléctricas necesarias para asegurar el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, incluyendo al menos:

- Reglamentación, titular de suministro y emplazamientos
- Características de la instalación
- Balance de potencias y funcionamiento
- Centros de seccionamiento y transformación (si fueran necesarios)
- Canalizaciones de baja y/o media tensión
- Cálculos eléctricos
- Red de tierras
- Eficiencia energética y coordinación de protecciones

Los cálculos eléctricos que sean necesarios serán redactados por un técnico especialista que podrá ser requerido en cualquier momento del proceso para la justificación de cualquier punto de este.

## **ANEJO N.º 10. Instrumentación y control**

Se desarrollará explicando el funcionamiento de los sistemas de instrumentación y control en la instalación proyectada, según los códigos estándar del Canal de Isabel II en su versión más reciente en el momento que se realice el proyecto. Deberá definir al menos:

- Instrumentación necesaria y elementos del proceso
- Automatas
- Integración con la red de comunicación existente
- Arquitectura del sistema de control
- Software y funciones del sistema
- Control de la instalación eléctrica
- Memoria de funcionamiento

En este anejo se deberá explicar perfectamente cómo funciona el sistema de instrumentación y control en las infraestructuras que se proponen en el proyecto.

## **ANEJO N.º 11. Cálculos estructurales y mecánicos**

Se realizará el cálculo mecánico de las distintas tuberías e instalaciones que se proyecten. Se deben definir los datos de partida, hipótesis, cálculo y resultados.

Los cálculos estructurales de los pozos de bombeo serán redactados por un técnico especialista que podrá ser requerido en cualquier momento del proceso para la justificación de cualquier punto de este.

Se realizarán cálculos de todos los elementos que así lo requieran. Éstos serán claros, definiendo los datos de partida, hipótesis, cálculo y resultados.

## **ANEJO N.º 12. Seguridad y salud**

El Estudio de Seguridad y Salud deberá contener todos los documentos que resulten preceptivos según las normas de prevención de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás normativa vigente de aplicación.

## **ANEJO N.º 13. Tramitación Ambiental**

- **El adjudicatario elaborará los documentos necesarios para la tramitación ambiental del proyecto.**
- Se tendrán en cuenta los requerimientos incluidos en el Documento Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Condicionado Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental resultante, según corresponda, para el diseño y valoración de las instalaciones.
- Dependiendo del alcance del proyecto, serán necesarios documentos de Restauración Ambiental y Paisajística o Programa de Vigilancia Ambiental que serán incluidos en el presente anejo, y serán elaborados por el adjudicatario.

- Se incluirá dentro del Plan de Vigilancia Ambiental el inventario de arbolado que puede verse afectado por las obras.
- El presupuesto del proyecto incluirá el presupuesto final que recoja las medidas de todos los documentos realizados y resoluciones obtenidas.

#### **ANEJO N.º 14. Tramitación arqueológica**

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación arqueológica realizada, para su consideración en el desarrollo del proyecto, así como para su inclusión en el mismo.
- El presupuesto del proyecto incluirá, cuando así lo marque la resolución, el presupuesto de las medidas arqueológicas a tomar.

#### **ANEJO N.º 15. Descripción del proceso constructivo**

- Se explicarán las fases de ejecución de las obras sobre todo cuando los procedimientos presentan alguna singularidad o dificultad
- Además de la explicación de los métodos constructivos, se acompañarán planos de ejecución que se tendrán en cuenta en la redacción del anejo de Plan de Obra.
- En las actuaciones puntuales y/o ampliaciones de infraestructuras existentes, se tomarán las medidas oportunas para afectar lo mínimo posible al mantenimiento y correcto funcionamiento de las instalaciones existentes.
- Para instalaciones existentes y ampliaciones, todos aquellos medios auxiliares necesarios para poder ejecutar la obra garantizando el mantenimiento y funcionamiento de la instalación deberán ser tenidos en cuenta y aparecerán recogidos en el presupuesto del proyecto.

#### **ANEJO N.º 16. Plan de Obra**

- Además del correspondiente Plan de Obra, en el que se reflejen los importes mensuales y los acumulados, se incluirá el INFORME DE OBRA, que enumera todas las unidades de obra por orden decreciente del porcentaje del presupuesto.
- El plazo de ejecución de las obras será consensuado con el Director del Proyecto

#### **ANEJO N.º 17. Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas**

- Se deberá contactar con todos los servicios (gas, electricidad, telefonía...) y organismos afectados por el Proyecto. Con la información obtenida se realizará una descripción de cada uno de los servicios afectados (carreteras, ferrocarril, vías pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, electricidad, comunicaciones, gas, oleoductos, etc.).
- En la conclusión de este anejo se incluirá un presupuesto que incluya los gastos derivados de las afecciones.
- Se estudiará el planeamiento territorial y urbanístico municipal afectado, por su posible interferencia en el proyecto y repercusión económica en el mismo.

### **ANEJO N.º 18. Autorizaciones administrativas necesarias**

- Se enumerarán las distintas autorizaciones administrativas a recabar antes del inicio de las obras, incluyendo la documentación elaborada para la obtención de los permisos ante el Organismo responsable (escrito de solicitud, planos, estudios, documentación complementaria). En concreto, se deberá elaborar la documentación
- Correspondiente para la ejecución de pasos elevados o bajo carreteras o vías de ferrocarril, obras en zona de protección de cauces o puntos de vertido, etc.
- Se incluirán los siguientes certificados:
  - o Declaración de obra completa
  - o Viabilidad geométrica
  - o Ordenación urbanística
  - o Cumplimiento del condicionado del Informe Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según el caso

### **ANEJO N.º 19. Control de calidad de las obras**

- El Adjudicatario elaborará el plan de control de calidad correspondiente a las obras.

### **ANEJO N.º 20. Gestión de residuos**

- Se redactará este anejo de acuerdo con la legislación vigente, por la que se regule la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
- En caso necesario el Adjudicatario analizará los posibles destinos de los residuos ofreciendo alternativas.

### **ANEJO N.º 21. Justificación de precios**

- **DOCUMENTO N.º 2. PLANOS**

Se presentarán tantos planos como sean precisos para la definición total de las obras:

Los planos se entregarán en AutoCAD y en formato GIS los planos de planta proyectada. Los planos y los elementos proyectados deberán estar referenciados en coordenadas UTM sistema ETRS 89.

A nivel orientativo, se elaborarán los siguientes planos:

1. Plano de Situación y emplazamiento.
2. Planta General.

3. Replanteo.
4. Planta de definición.
5. Instalación electromecánica
  - 5.1. Planta general y urbanización
  - 5.2. Definición geométrica
  - 5.3. Estructura
  - 5.4. Equipos mecánicos
  - 5.5. Instalaciones eléctricas
6. Conducciones.
  - 6.1. Planta trazado y replanteo.
  - 6.2. Longitudinales.
  - 6.3. Secciones tipo.
7. Detalles singulares.
  - 7.1. Conexión a redes existentes
  - 7.2. Arquetas de rotura de carga
  - 7.3. Secciones tipo de elementos singulares, zanjas, pozos de registro, cámaras, anclajes, etc.
  - 7.4. Conexiones de acometidas e imbornales.
  - 7.5. Drenaje.
8. Servicios afectados y reposiciones.
  - 8.1. Servicios afectados.
  - 8.2. Reposiciones.
  - 8.3. Protección de servicios afectados.

• **DOCUMENTO N.º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

Se elaborará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (en adelante, PPTP) de las obras comprendidas en el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el art. 233.c de la LCSP.

A los efectos de regular la ejecución de las obras, el PPTP del Proyecto deberá incluir expresamente una descripción de las obras, las condiciones de ejecución, las obligaciones de orden técnico que correspondan al Contratista de las obras, las instrucciones para la medición y valoración de las unidades de obra, así como sobre el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

Se prestará especial atención en la definición de las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, además, el pliego especificará las normas y pruebas previstas para la recepción.



Este documento incluirá:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

- **DOCUMENTO N.º 4. PRESUPUESTO**

El presupuesto lo realizará el Adjudicatario, salvo justificación de lo contrario, utilizando los cuadros de precios indicados por Canal de Isabel II, y estará compuesto por:

1. Mediciones Auxiliares
2. Mediciones Generales
3. Cuadro de precios N.º 1
4. Cuadro de precios N.º 2
5. Presupuestos Parciales
6. Presupuestos Generales
7. Resumen de presupuestos

Tanto mediciones como presupuestos parciales y generales irán precedidos por un índice en el que se vea los capítulos en los que se estructuran.

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluirá dentro del anejo correspondiente y en el presupuesto se definirá una unidad que haga referencia al mencionado Anejo.

Los presupuestos se realizarán en PRESTO o formato compatible.

Madrid, a la fecha de la firma.

Firmado por E. Vicente Muñoz Martínez el día  
04/02/2025

Eladio Vicente Muñoz Martínez

Jefe Área Técnica



## **6. PLANO Y FICHAS DE LAS ACTUACIONES**

**(En caso de discrepancias entre el plano general de actuaciones y las fichas finales, tendrán prevalencia estas últimas al ser el plano de fecha anterior)**





ACTUACIÓN: ALC\_FRO\_P1A\_01

Descripción: Actuación sobre colectores. La actuación ALC\_FRO\_P1A\_01 se localiza en la M-521 a su llegada a Fresnedillas de la Oliva desde el oeste. Esta actuación es la primera de una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Esta conecta la Fosa Séptica A con Qp = 0,93 l/s. Conlleva la ejecución de un tramo de colector en gravedad de 178 m de 400 mm de PVC y pendiente de 3,7‰ que conecta con una nueva EBAR que bombeará el equivalente a Qp de vuelta a la red de alcantarillado. El equipo de bombeo conecta con una impulsión de 167,1 m de longitud con conductos de 50 mm de PVC. Tras la arqueta de rotura se propone un colector en gravedad de 334,2 m de 400 mm de PVC que conecta con el límite oeste de la red de alcantarillado urbano de Fresnedillas de la Oliva.

En la valoración, se ha presupuestado un solo conducto para la impulsión y se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%). Mediante esta actuación se da solución a la problemática número 9 (Fosas sépticas), definida en el Documento 1 – Estudios previos.

PRIORIDAD: P1A		UBICACIÓN: M-521	
Resumen:			
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN	LONGITUD (m)	DIÁMETRO ANTERIOR (mm)	DIÁMETRO PROPUESTO (mm)
Colector de nueva ejecución	512,2	---	400
Impulsión de nueva ejecución	167,1	---	50
TOTAL		679,3	
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN			
EBAR de nueva ejecución			
		Longitud total de colectores a renovar y de nueva ejecución (m): 679,3	

Valoración Económica:		Valoración: 688.174,10 €	
Cap.1 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA	35.291,81 €	19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + B.I.)	100.193,93 €
Cap.2 DEMOLICIONES	2.382,70 €	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)	627.530,41 €
Cap.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS	258.201,55 €		
Cap.4 REPOSICIONES Y FIRMES	69.837,02 €	2% COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	10.546,73 €
Cap.5 ELEMENTOS AUXILIARES	122.561,44 €	4% PROYECTO CONSTRUCTIVO	21.093,46 €
Cap.6 OBRA CIVIL	0,00 €	4% DIRECCIÓN FACULTATIVA	21.093,46 €
Cap.7 VARIOS	0,00 €	1,5% CONTROL DE CALIDAD	7.910,05 €
Cap.8 BOMBEO PROVISIONAL	0,00 €	TOTAL OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (O.G.A.)	60.043,69 €
Cap.9 3‰ SEGURIDAD Y SALUD	14.648,24 €		
Cap.10 5‰ SERVICIOS AFECTADOS	24.413,73 €	PRESUPUESTO TOTAL (P.B.L. + O.G.A.)	688.174,10 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)		527.336,48 €	

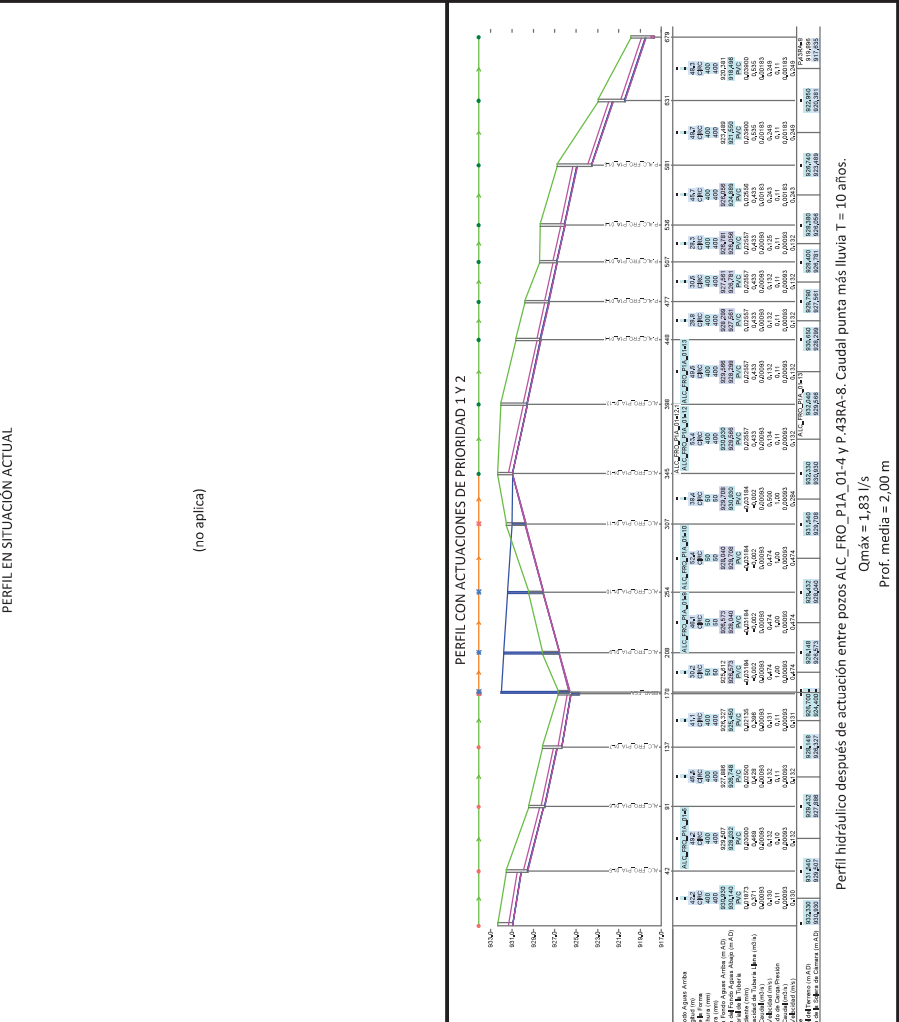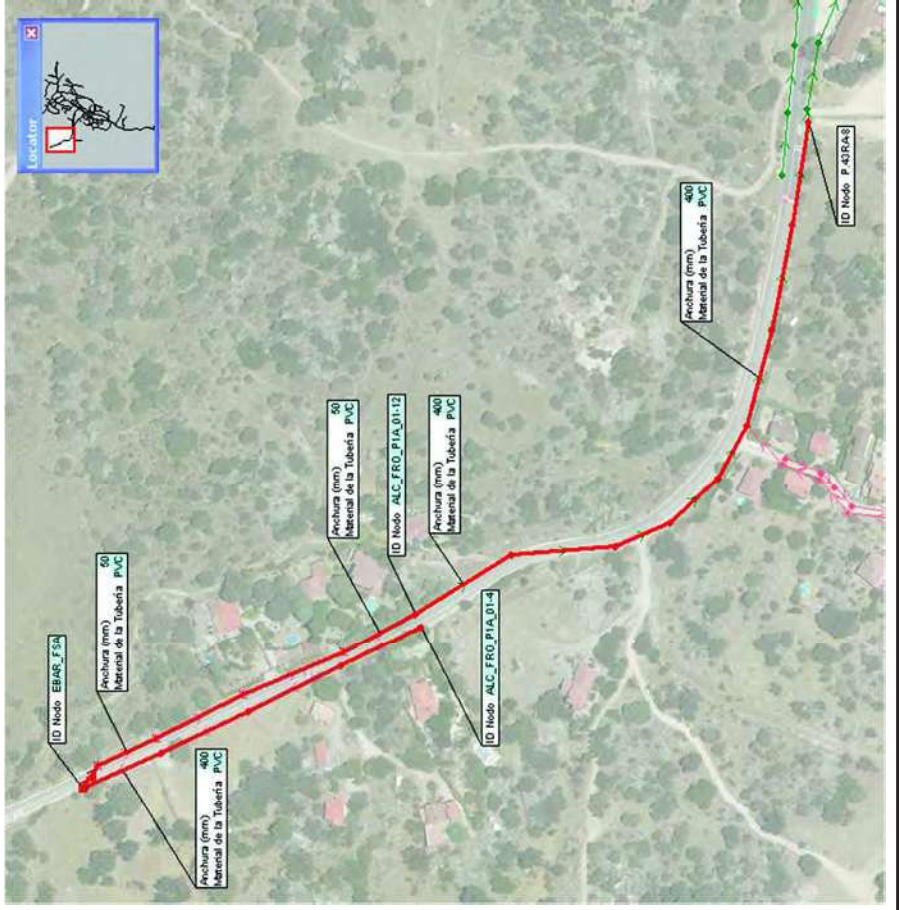

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_01-4 y P-43RA-8. Caudal punta más lluvia T = 10 años.  
Qmáx = 1,83 l/s  
Prof. media = 2,00 m

ACTUACIÓN: ALC\_FRO\_P1A\_02




Descripción: Actuación sobre colectores. La actuación ALC\_FRO\_P1A\_02 se localiza en la zona oeste de Fresnedillas de la Oliva y se sitúa en la Calle de Vicente Rubio.

Esta actuación es la segunda de una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Esta conecta la Fosa Séptica B con Qp = 0,90 l/s. Conlleva la ejecución de un tramo de colector en gravedad, 145 m en total, de 400 mm de PVC que conecta con una nueva EBAR. El equipo de bombeo conecta con una impulsión de 159,4 m de longitud total con conductos de 50 mm de PVC. Esta impulsión conecta con el último tramo en gravedad propuesto en la ALC\_FRO\_P1A\_01.

En la valoración, se ha presupuestado un solo conducto para la impulsión y se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%). Mediante esta actuación se da solución a la problemática número 8 (Fosas sépticas), definida en el Documento 1 – Estudios previos.

PRIORIDAD:	P1A	UBICACIÓN:	Calle de Vicente Rubio
<b>Resumen:</b>			
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN	LONGITUD (m)	DIÁMETRO ANTERIOR (mm)	DIÁMETRO PROPUESTO (mm)
Colector de nueva ejecución	145,0	---	400
Impulsión de nueva ejecución	159,4	---	50
TOTAL	304,4		
<b>TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN</b>			
EBAR de nueva ejecución	304,4		

Valoración Económica:		Valoración:	382.434,66 €
Cap. 1. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA	10.232,05 €	19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + B.I.)	55.680,14 €
Cap. 2. DEMOLICIONES	1.035,16 €	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)	348.735,52 €
Cap. 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS	116.074,84 €		
Cap. 4. REPOSICIONES Y FIRMES	30.275,00 €	2% COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	5.861,07 €
Cap. 5. ELEMENTOS AUXILIARES	113.728,67 €	4% PROYECTO CONSTRUCTIVO	11.722,14 €
Cap. 6. OBRA CIVIL	0,00 €	4% DIRECCIÓN FACULTATIVA	11.722,14 €
Cap. 7. VARIOS	0,00 €	1,5% CONTROL DE CALIDAD	4.395,80 €
Cap. 8. BOMBEO PROVISIONAL	0,00 €	TOTAL OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (O.G.A.)	33.701,14 €
Cap. 9. 3% SEGURIDAD Y SALUD	8.140,37 €	PRESUPUESTO TOTAL (P.B.L. + O.G.A.)	382.434,66 €
Cap. 10. 5% SERVICIOS AFECTADOS	13.567,29 €		
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)	299.053,38 €		

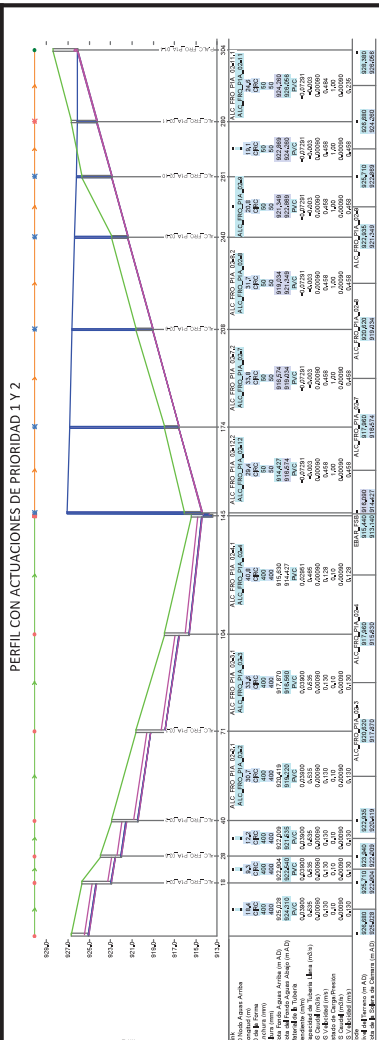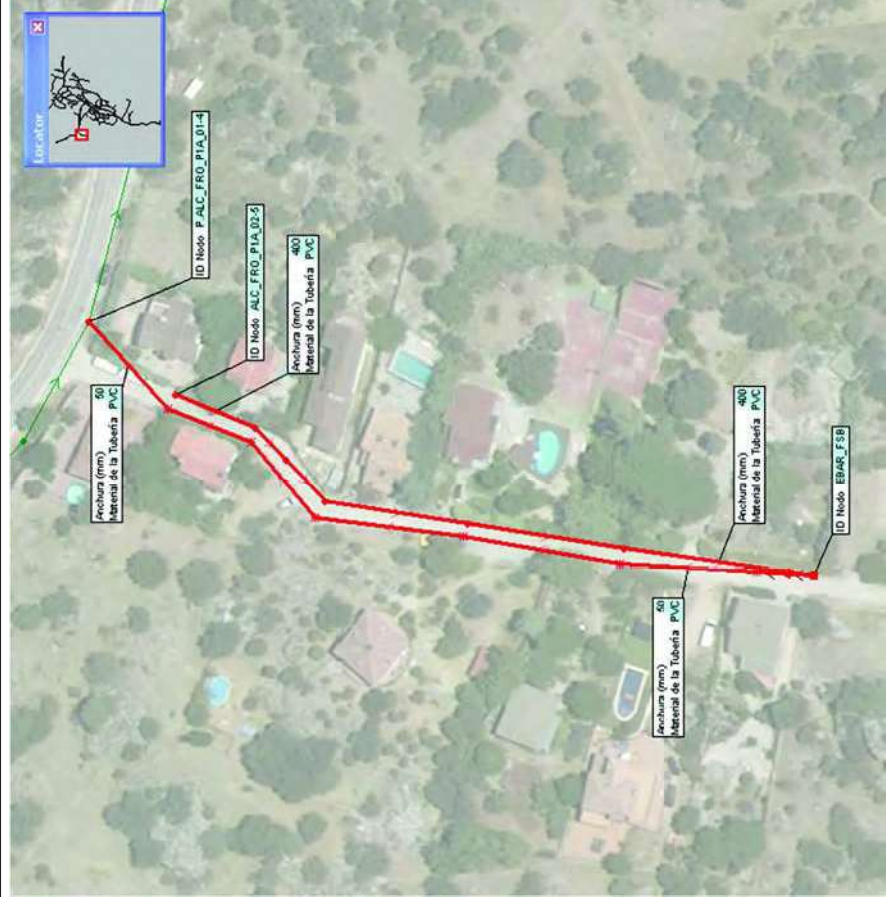

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_02-5 y P.ALC\_FRO\_P1A\_01-4. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

Qmáx = 0,90 l/s  
Prof. media = 2,18 m

ACTUACIÓN: ALC\_FRO\_P1A\_03

Descripción:

Actuación sobre colectores. La actuación ALC\_FRO\_P1A\_03 se localiza en la zona norte de Fresnedillas de la Oliva y se sitúa en la Calle Bella Vista, Camino Peralejo y Calle de San Bartolomé.

Esta actuación es la tercera de una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Esta conecta la Fosa Séptica C con Qp = 1,17 l/s y Fosa Séptica D con Qp = 1,02 l/s. Conlleva la ejecución de cuatro tramos de colector en gravedad de 313,3 m en total de 400 mm de PVC y pendiente del 2,8‰ que conectan con tres nuevos EBAR que bombearán el equivalente a Qp de vuelta a la red de alcantarillado. Los equipos de bombeo conectan con impulsiones de 390,1 m de longitud total con conductos de 50 mm de PVC. Las zonas de fosas se han dividido según la topografía del terreno, el reparto de caudal se ha realizado en proporción al área de cada zona. La zona sur de la Fosa Séptica E conectará directamente a la red de alcantarillado ya que la topografía lo permite.

En la valoración, se ha presupuestado un solo conducto para la impulsión y se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%). Mediante esta actuación se da solución a la problemática número 5 y 10 (Fosas sépticas), definida en el Documento 1 – Estudios previos.

PRIORIDAD: P1A

UBICACIÓN:

Calle Bella Vista, Calle del Poeta Luís Chamizo, Calle del Poeta Miguel Hernández, Camino Peralejo, Calle de San Bartolomé

Valoración: 797.868,46 €

Resumen:

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Colector de nueva ejecución

Impulsión de nueva ejecución

TOTAL

LONGITUD (m)

---

---

DIÁMETRO ANTERIOR (mm)

---

---

DIÁMETRO PROPUESTO (mm)

400

50

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN



EBAR de nueva ejecución

Longitud total de colectores a renovar y de nueva ejecución (m):

703,4

Valoración Económica:

Cap. 1. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA	22.206,60 €	19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + B.I.)	116.164,76 €
Cap. 2. DEMOLICIONES	2.383,63 €	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)	727.558,21 €
Cap. 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS	246.257,17 €		
Cap. 4. REPOSICIONES Y FIRMES	69.696,20 €	2% COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	12.227,87 €
Cap. 5. ELEMENTOS AUXILIARES	225.561,44 €	4% PROYECTO CONSTRUCTIVO	24.455,74 €
Cap. 6. OBRA CIVIL	0,00 €	4% DIRECCIÓN FACULTATIVA	24.455,74 €
Cap. 7. VARIOS	0,00 €	1,5% CONTROL DE CALIDAD	9.170,90 €
Cap. 8. BOMBEO PROVISIONAL	0,00 €	TOTAL OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (O.G.A.)	70.310,25 €
Cap. 9. 3‰ SEGURIDAD Y SALUD	16.983,15 €		
Cap. 10. 5‰ SERVICIOS AFECTADOS	28.305,25 €	PRESUPUESTO TOTAL (P.B.L. + O.G.A.)	797.868,46 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)	611.393,45 €		

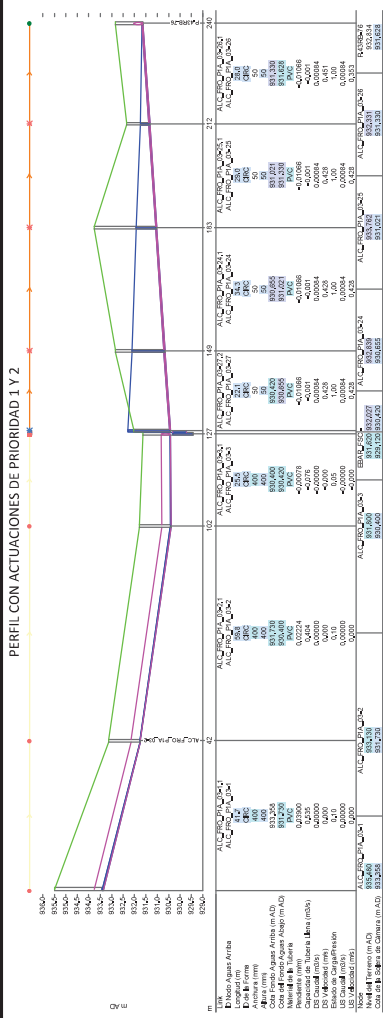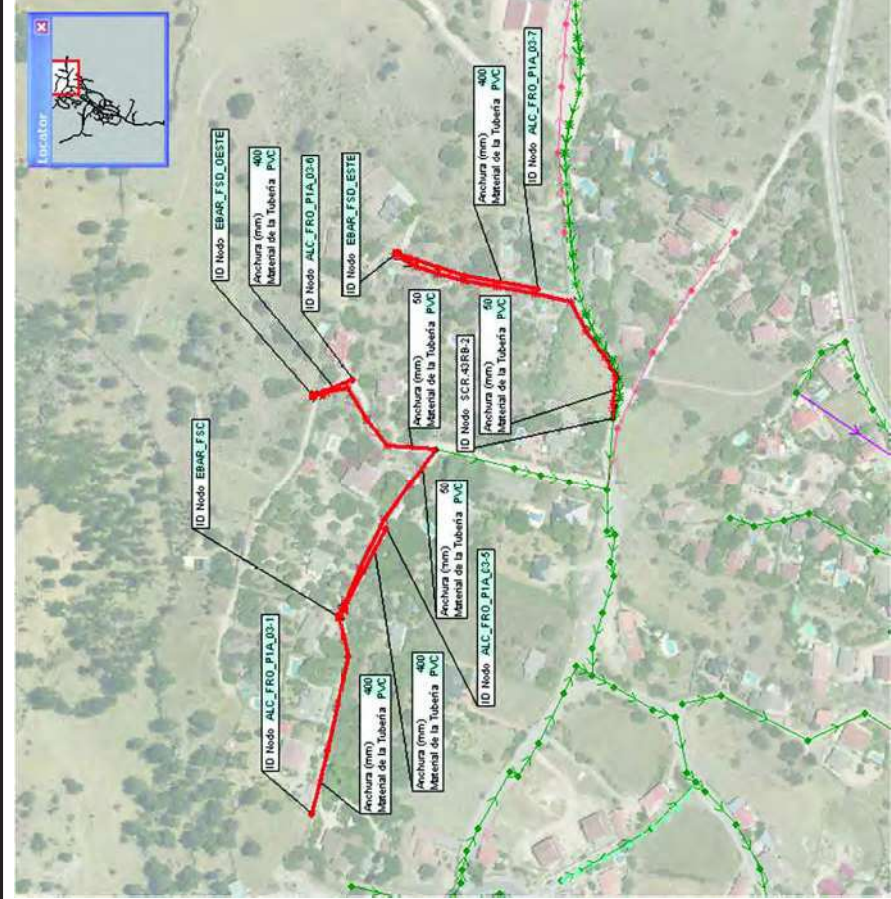


Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_03-1 y P.43R8-76. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

Qmáx = 0,84 l/s

Prof. media = 1,96 m

PERFIL CON ACTUACIONES DE PRIORIDAD 1 Y 2

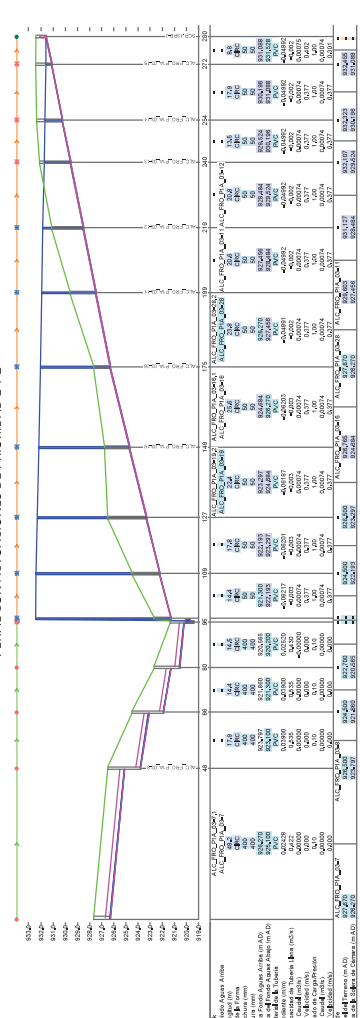

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_03-7 y SCR-43R8-2. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

Qmáx = 0,74 l/s

Prof. media = 1,96 m

ACTUACIÓN: ALC\_FRO\_P1A\_04

Descripción:

Actuación sobre colectores. La actuación ALC\_FRO\_P1A\_04 se localiza en la zona noreste de Fresnedillas de la Oliva y se sitúa en la Calle de San Bartolomé y Camino Peralejo. A continuación de la actuación ALC\_FRO\_P1A\_03. Esta actuación es la cuarta de una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Esta conecta la Fosa Séptica E con Qp = 0,54 l/s. Debido a la orografía del terreno, esta zona se ha dividido en dos. Por lo tanto, conlleva la ejecución de dos tramos de colector en gravedad de 382,9 m en total de 400 mm de PVC y una pendiente media de 2,8‰. El tramo norte conecta con la EBAR Fresnedillas, mientras que el tramo sur conecta con el pozo P 43RB-72 perteneciente a la red de alcantarillado urbano. Se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%) al presupuestar la actuación. Mediante esta actuación se da solución a la problemática número 7 (Fosas sépticas), definida en el Documento 1 – Estudios previos.


PRIORIDAD: P1A

UBICACIÓN:


Camino Peralejo, Calle de San Bartolomé

Valoración Económica:

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN	LONGITUD (m)	DIÁMETRO ANTERIOR (mm)	DIÁMETRO PROPUESTO (mm)	VALORACIÓN
Colector de nueva ejecución	382,9	---	400	
Longitud total de colectores a renovar y de nueva ejecución (m): 382,9				
Cap. 1 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA				26.113,93 €
Cap. 2 DEMOLICIONES				1.379,32 €
Cap. 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS				159.534,58 €
Cap. 4 REPOSICIONES Y FIRMES				40.501,10 €
Cap. 5 ELEMENTOS AUXILIARES				8.832,77 €
Cap. 6 OBRA CIVIL				0,00 €
Cap. 7 VARIOS				0,00 €
Cap. 8 BOMBEO PROVISIONAL				0,00 €
Cap. 9 3‰ SEGURIDAD Y SALUD				7.090,85 €
Cap. 10 5‰ SERVICIOS AFECTADOS				11.819,09 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)				255.270,64 €
19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + B.I.)				48.501,42 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)				303.772,06 €
2% COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD				5.105,41 €
4% PROYECTO CONSTRUCTIVO				10.110,83 €
4% DIRECCIÓN FACULTATIVA				10.110,83 €
1,5% CONTROL DE CALIDAD				3.829,06 €
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (O.G.A.)				29.356,12 €
PRESUPUESTO TOTAL (P.B.L. + O.G.A.)				333.128,18 €

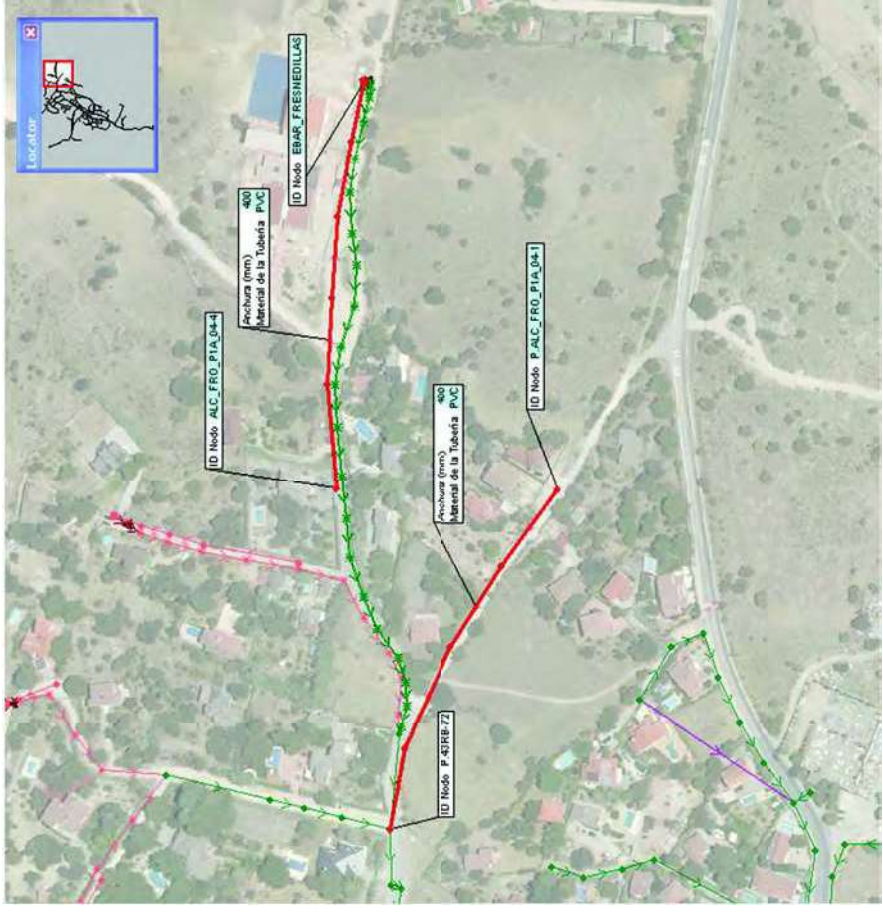


PERFIL CON ACTUACIONES DE PRIORIDAD 1 Y 2

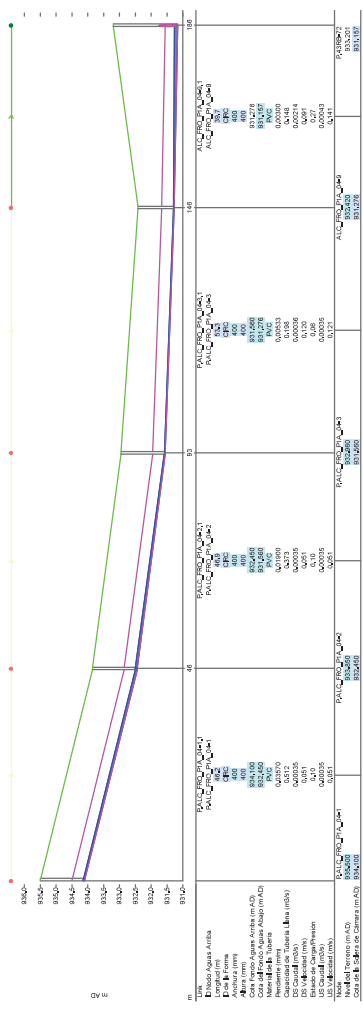

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_04-1 y P 43RB-72. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

Qmáx = 2,14 l/s  
Prof. media = 2,14 m

PERFIL CON ACTUACIONES DE PRIORIDAD 1 Y 2

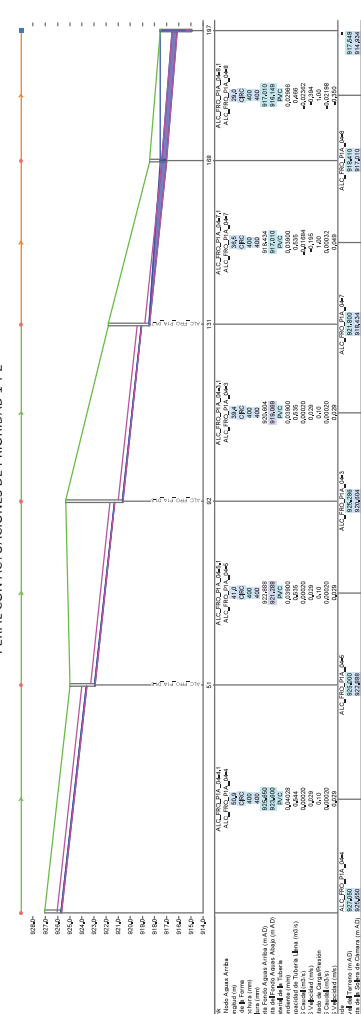

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_04-4 y EBAR\_FRESNEDILLAS. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

Qmáx = 0,20 l/s  
Prof. media = 2,14 m

ACTUACIÓN: ALC\_FRO\_P1A\_05

Descripción: Actuación sobre colectores. La actuación ALC\_FRO\_P1A\_05 se localiza en la zona sur de Fresnedillas de la Oliva y se sitúa en la Calle de la Viña. Esta actuación es la quinta de una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Esta conecta la Fosa Séptica F con Qp = 0,21 l/s. Conlleva la ejecución de un tramo de colector en gravedad de 58,1 m de 400 mm de diámetro de PVC y pendiente del 1,2%. Este se conecta a la red de alcantarillado urbano en el pozo P.53AB-25. Se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%) al presupuestar la actuación. Mediante esta actuación se da solución a la problemática número 6 (Fosas sépticas), definida en el Documento 1 – Estudios previos.


PRIORIDAD:	P1A	UBICACIÓN:			Calle de la Viña
Resumen:					
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN		LONGITUD (m)	DIÁMETRO ANTERIOR (mm)	DIÁMETRO PROPUESTO (mm)	
Colector de nueva ejecución		58,1	---	400	
		Longitud total de colectores a renovar y de nueva ejecución (m):			
		58,1			



PERFIL EN SITUACIÓN ACTUAL

(no aplica)

PERFIL CON ACTUACIONES DE PRIORIDAD 1 Y 2

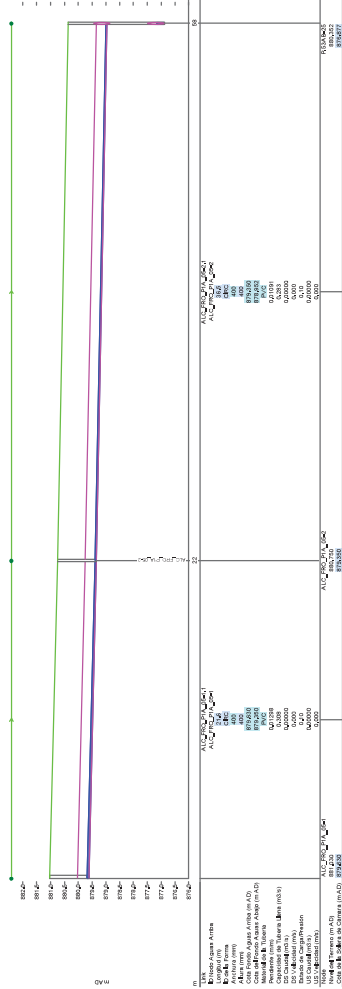

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos ALC\_FRO\_P1A\_05-1 y P.53AB-25. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

Qmáx = 0,00 m³/s  
Prof. media = 1,92 m


**ACTUACIÓN:** ALC FRO P1A 06

Actuación sobre colectores. La actuación ALC FRO P1A 06 se localiza en la zona sur de Fresnedillas de la Oliva y se sitúa en la Calle Povedano y Calle del Real.

Descripción:	<p>Actuación sobre colectores. La actuación ALC_R10A_06 se localiza en la zona sur de Fresnedillas de la Oliva y se sitúa en la Calle Povedano y Calle del Real. Esta actuación es la sexta y última de una serie de actuaciones que tienen como fin conectar las fosas sépticas del municipio. Esta acción se realiza en el pozo P.53AA-75 a la red de alcantarillado urbano. Los últimos tramos transcurrirán por propiedad privada y edificada por lo que será necesario plantear una zona de servidumbre y obtener los permisos correspondientes. Destacar que, de manera localizada en los últimos tramos de la presente actuación, existen pendientes inferiores al 1 % (mínimo recomendado según las NRS/CVIL v. 2016) que se aminorarán en fase de proyecto.</p>
--------------	--


Se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%) al presupuestar la actuación. Mediante esta actuación se da solución a la problemática número 11 (Fosas sépticas), definida en el Documento 1 – Estudios previos.

PRIORIDAD:	P1A	UBICACIÓN:	Calle Povedano, Calle del Real	Valoración Económica:	Valoración:	388.383,28 €
Resumen:						
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN		LONGITUD (m)	DIÁMETRO ANTERIOR (mm)	DIÁMETRO PROPUESTO (mm)		
Colector de nueva ejecución		407,3	---	400		
				Cap. 1 COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA	27.778,02 €	19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + B.I.)
				Cap. 2 DEMOLICIONES	1.467,22 €	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)
				Cap. 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS	193.302,29 €	56.546,22 €
				Cap. 4 REPOSICIONES Y FIRMES	43.082,00 €	354.157,09 €
				Cap. 5 ELEMENTOS AUXILIARES	9.936,86 €	
				Cap. 6 OBRA CIVIL	0,00 €	2% COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
				Cap. 7 VARIOS	0,00 €	4% PROYECTO CONSTRUCTIVO
				Cap. 8 BOMBEO PROVISIONAL	0,00 €	4% DIRECCIÓN FACULTATIVA
				Cap. 9 3% SEGURIDAD Y SALUD	8.266,99 €	15% CONTROL DE CALIDAD
				Cap. 10 5% SERVICIOS AFECTADOS	13.778,32 €	TOTAL OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (O.G.A.)
				TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)	297.611,71 €	34.235,35 €
Longitud total de colectores a renovar y de nueva ejecución (m):				407,3		
						PRESUPUESTO TOTAL (P.B.L. + O.G.A.)
						388.383,28 €

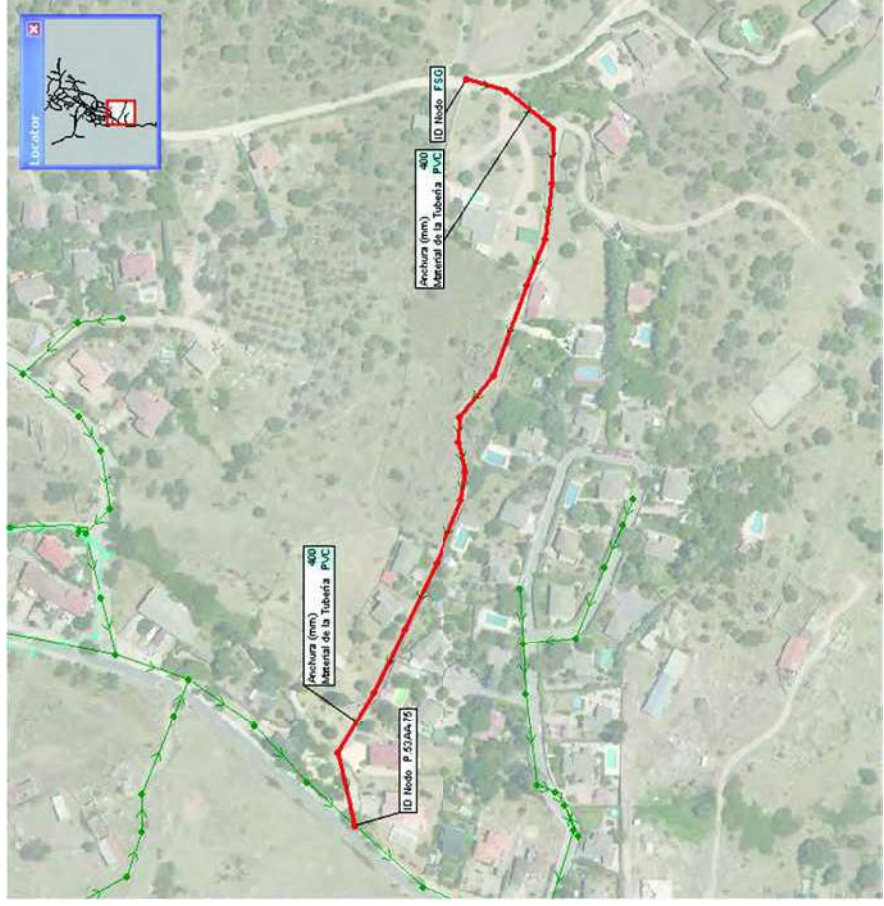

(no aplica)

PERFIL CON ACTUACIONES DE PRIORIDAD 1 Y 2

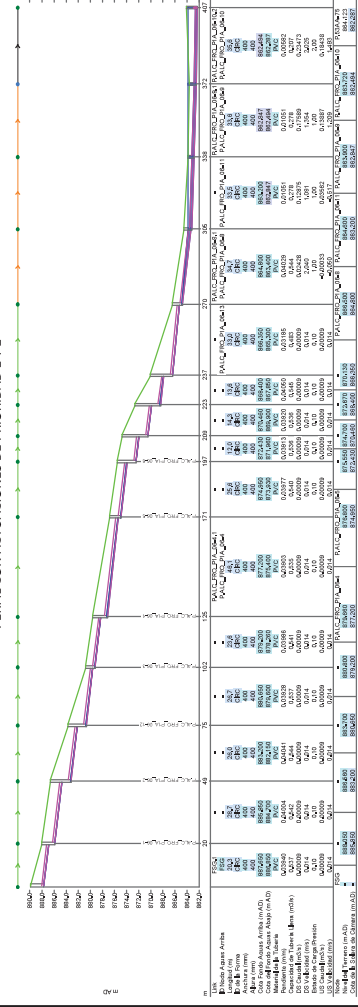

Perfil hidráulico después de actuación entre pozos FSG y P.53AA-75. Caudal punta más lluvia T = 10 años.

$$Q_{\text{máx}} = 0,234 \text{ m}^3/\text{s}$$

Prof. media = 2,53 m

ACTUACI  N: ALC\_FRO\_P1B\_02

Actuaci  n sobre colectores. La actuaci  n ALC\_FRO\_P1B\_02 se sit  a en la Calle de la Fragua y Calle de las Fuentes. Se propone el retranqueo del colector que discurre por parcela privada. En este caso y debido a la conexi  n de acometidas se mantiene el colector existente, aunque se desv  a el tramo que discurre desde el norte a partir del P.53AB-48. Conlleva la ejecuci  n de un nuevo colector de PVC de 400 mm de di  metro (91,1 m) y 500 mm de di  metro (85,2 m). 176,3 m en total y pendiente del 3,6%. Esta actuaci  n incluye la reconexi  n de 18 acometidas. Se ha considerado un tipo de terreno especialmente duro (90%) y expansivo (10%) al presupuestar la actuaci  n. Mediante esta actuaci  n se da soluci  n a la problem  tica generalizada n  mero 13 (Falta de accesibilidad), definida en el Documento 1 – Estudios previos.

PRIORIDAD: P1B UBICACI  N: Calle de la Fragua, Calle de las Fuentes

Resumen:


TIPOLOG��A DE ACTUACI��N	LONGITUD (m)	DI��METRO ANTERIOR (mm)	DI��METRO PROPUESTO (mm)
Retranqueo de colector	91,1	---	400
Retranqueo de colector	85,2	---	500
TOTAL	176,3		

Longitud total de colectores a renovar y de nueva ejecuci  n (m): 176,3

TIPOLOG��A DE ACTUACI��N	N��MERO DE ACOMETIDAS
Reconexi��n de acometidas	18

Valoraci  n Econ  mica:


Cap. 1 COLOCACI��N DE LA TUBER��A	16.858,66 ��	19% GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL (G.G. + B.I.)	38.172,94 ��
Cap. 2 DEMOLICIONES	662,47 ��	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACI��N (P.B.L.)	239.083,14 ��
Cap. 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS	83.524,09 ��		
Cap. 4 REPOSICIONES Y FIRMES	19.470,58 ��	2% COORDINACI��N DE SEGURIDAD Y SALUD	4.018,20 ��
Cap. 5 ELEMENTOS AUXILIARES	5.520,48 ��	4% PROYECTO CONSTRUCTIVO	8.036,41 ��
Cap. 6 OBRA CIVIL	0,00 ��	4% DIRECCI��N FACULTATIVA	8.036,41 ��
Cap. 7 VARIOS	0,00 ��	1,5% CONTROL DE CALIDAD	3.013,65 ��
Cap. 8 BOMBEO PROVISIONAL	0,00 ��	TOTAL OTROS GASTOS DE LA ADMINISTRACI��N (O.G.A.)	23.104,67 ��
Cap. 9 3% SEGURIDAD Y SALUD	5.580,84 ��		
Cap. 10 5% SERVICIOS AFECTADOS	9.301,40 ��	PRESUPUESTO TOTAL (P.B.L. + O.G.A.)	262.187,81 ��
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCI��N MATERIAL (P.E.M.)	200.910,20 ��		

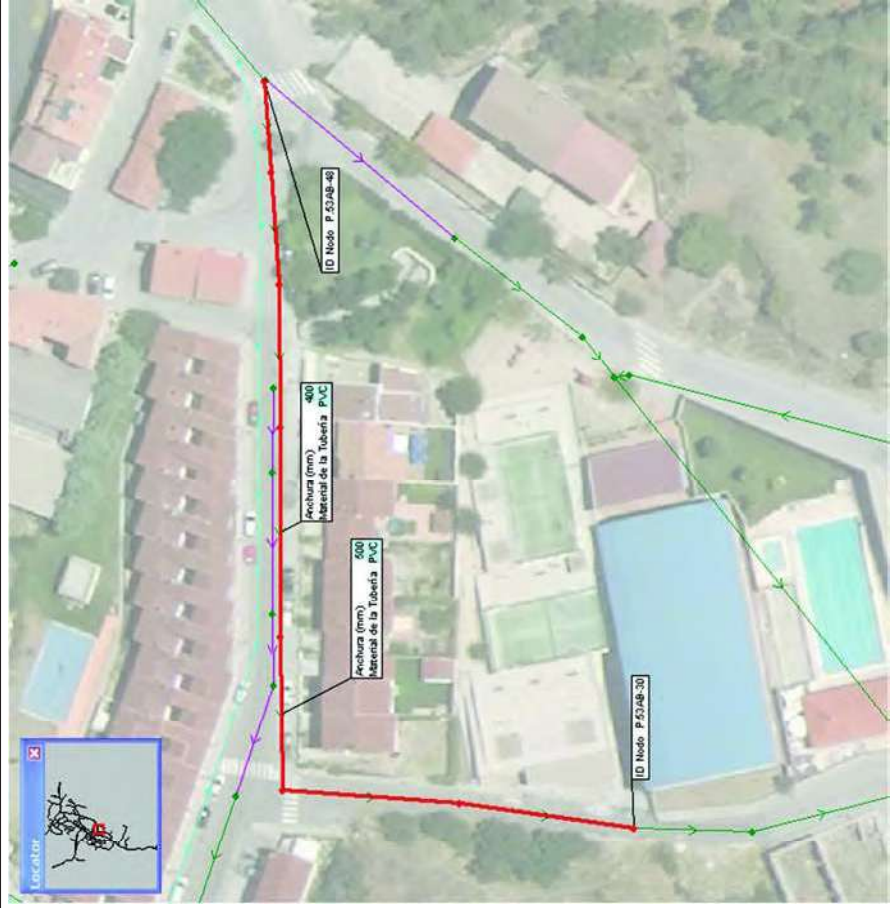

PERFIL EN SITUACI  N ACTUAL

(no aplica)

PERFIL CON ACTUACIONES DE PRIORIDAD 1 Y 2

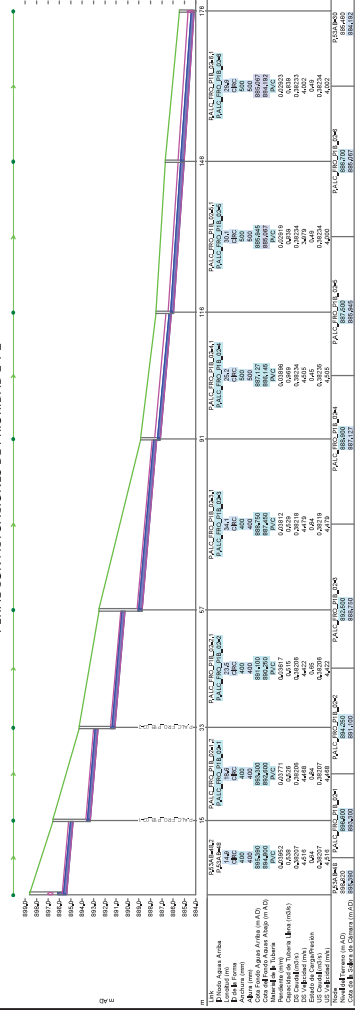

Perfil hidr  ulico despu  s de actuaci  n entre pozos P.43RB-67 y P.53AB-30. Caudal punta m  s lluvia T = 10 a  os.

Qm  x = 0,382m  /s

Prof. media = 2,49 m
